



RAPORT 2022

PRZEGLĄD ZMIAN
W ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

CZĘŚĆ II

OCENA REALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM



Opracowanie:

Departament Strategii i Rozwoju

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

tel. 81 44 16 545, fax. 81 44 16 544

strategia@lubelskie.pl

www.lubelskie.pl

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	5
1. DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ WPROWADZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO PZPWL 2015	6
2. STOPNIENI REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UMIESZCZONYCH W PZPWL 2015	10
2.1. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych, dróg rowerowych oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej.....	10
2.1.1. Drogi krajowe.....	10
2.1.2. Drogi wojewódzkie.....	12
2.1.2.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa WL.....	12
2.1.2.2. Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich WL	15
2.1.2.3. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego.....	20
2.1.3. Trasy rowerowe	20
2.1.4. Teleinformatyka	21
2.2. Budowa, rozbudowa i przebudowa linii kolejowych wraz z infrastrukturą towarzystającą	21
2.3. Budowa i rozbudowa przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, gazów i energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25
2.3.1. Elektroenergetyka.....	25
2.3.2. Paliwa energetyczne.....	35
2.4. Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznych urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania	36
2.4.1. Infrastruktura oczyszczania i odprowadzania ścieków	36
2.4.2. Infrastruktura odzysku i unieszkodliwiania odpadów	43
2.5. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	46
2.6. Ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego.....	78
2.7. Budowa, rozbudowa i modernizacja budynków dla urzędów organów władzy, administracji, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia	78
2.8. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej.....	81

2.9. Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górnictw.....	81
3. PODSUMOWANIE.....	82
4. SPIS TABEL	91
5. SŁOWNIK SKRÓTÓW.....	93

WPROWADZENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, stanowi integralną część Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa, w której w formie tabelarycznej zawarto szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji inwestycji wskazanych w rozdz. VIII PZPWL 2015 – Zadania i inwestycje celu publicznego.

Wykaz inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obejmuje zadania inwestycyjne ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub Sejmik Województwa Lubelskiego i Zarząd Województwa Lubelskiego. W związku z tym, w ramach prac nad Raportem, analizie i ocenie poddano:

- stopień aktualności dokumentów, które stanowiły podstawę wprowadzenia zadań inwestycyjnych do PZPWL 2015,
- stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych umieszczonych w PZPWL 2015.

Przedstawione w Raporcie **informacje** dotyczące wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych **poddane zostały weryfikacji przez podmioty właściwe do ich realizacji**, w tym w zakresie:

- budowy, rozbudowy i przebudowy linii kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przez:
 - Departament Infrastruktury i Majątku Województwa UMWL,
- budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej – przez:
 - Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie,
- budowy i rozbudowy przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, gazów i energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przez:
 - Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Polskie Sieci Energetyczne S.A., PGE Dystrybucja, PKP Energetyka S.A.,
- budowy, rozbudowy i modernizacji publicznych urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania – przez:
 - Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL,
- budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacji i utrzymywania wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – przez:
 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ze względu na zakres merytoryczny Raportu obejmujący przestrzenne aspekty realizacji inwestycji celu publicznego, charakter dokumentów sektorowych stanowiących podstawę identyfikacji planowanych zadań, zróżnicowany stopień przygotowania dokumentacji poszczególnych przedsięwzięć, a także odrębność procesów planowania lokalizacji oraz pozyskiwania środków na realizację inwestycji, Raport nie zawiera informacji dotyczących źródeł finansowania planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych.

1. DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ WPROWADZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO PZPWL 2015

Do dokumentów, które określają inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w PZPWL 2015 należą odpowiednio:

- dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów,
- dokumenty przyjęte przez właściwego ministra,
- dokumenty przyjęte przez Sejmik Województwa Lubelskiego / Zarząd Województwa Lubelskiego.

Tab. 1. Dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów

Lp.	Podstawa wprowadzenia zadań inwestycyjnych do PZPWL 2015	Dokument zmieniający	Ocena aktualności
1.	Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – przyjęta Uchwałą nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.)	-	dokument uchylony dn. 13.11.2020 r.
2.	Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 – przyjęty Uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r.	Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) – przyjęty Uchwałą nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.	dokument zmieniony
3.	Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. – przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 277 z dnia 19 grudnia 2008 r.	Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030 przyjęta Uchwałą nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. (M.P. 2019 poz. 1054)	dokument zmieniony
4.	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (IV aktualizacja) – oczekujący na przyjęcie przez Radę Ministrów	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (V aktualizacja) – przyjęty przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r.	dokument zmieniony

Lp.	Podstawa wprowadzenia zadań inwestycyjnych do PZPWL 2015	Dokument zmieniający	Ocena aktualności
5.	MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisły – przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów dnia 26 sierpnia 2014 r.	Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjęty w formie Rozporządzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r.	dokument zmieniony
6.	Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego – przyjęty Uchwałą nr 235 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r.	Zmiana Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego – przyjęta Uchwałą nr 58 Rady Ministrów w dniu 5 maja 2017 r. (M.P. 2017 poz. 524)	dokument zmieniony
7.	Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 2012 – 2016 (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r., Dz.U. 2019.2198)	<p>Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 2140)</p> <p>Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2022-2025 (Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r., Dz.U. 2021 poz. 2448)</p>	dokument zmieniony
8.	Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549)	Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjęty w formie Rozporządzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r.	dokument zmieniony
9.	Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 – przyjęty przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 5 listopada 2013 r.	<p>Krajowy Program Kolejowy do roku 2023 – przyjęty Uchwałą nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r.</p> <p>Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 – Uchwała Nr 156/2021 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2021 r.</p>	dokument zmieniony

Lp.	Podstawa wprowadzenia zadań inwestycyjnych do PZPWL 2015	Dokument zmieniający	Ocena aktualności
10.	Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) – przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 października 2014 r.	-	dokument aktualny

Tab. 2. Dokumenty przyjęte przez właściwego ministra

Lp.	Podstawa wprowadzenia zadań inwestycyjnych do PZPWL 2015	Dokument zmieniający	Ocena aktualności
1.	Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) - ogłoszony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 19 listopada 2013 r.	-	dokument aktualny

Tab. 3. Dokumenty przyjęte przez Sejmik Województwa Lubelskiego/Zarząd Województwa Lubelskiego

Lp.	Podstawa wprowadzenia zadań inwestycyjnych do PZPWL 2015	Dokument zmieniający	Ocena aktualności
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029 (Wykaz Planowanych i Realizowanych Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Lubelskiego) – Uchwała Nr XLVII/742/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 lipca 2014 r.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2017-2030 – Uchwała Nr XXXIV/456/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 października 2017 r.	dokument zmieniony

Lp.	Podstawa wprowadzenia zadań inwestycyjnych do PZPWL 2015	Dokument zmieniający	Ocena aktualności
2.	Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa lubelskiego na lata 2012-2020 – Uchwała Nr CXXII/2471/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2012 r.	Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa lubelskiego na lata 2012-2030 – Uchwała Nr CCLXIX/4739/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8.06.2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa lubelskiego na lata 2012-2020.	dokument zmieniony
3.	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 – Uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 2 grudnia 2016 r.	dokument zmieniony

Większość dokumentów stanowiących podstawę identyfikacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w PZPWL 2015 została zaktualizowana. W tym kontekście, w odniesieniu do potencjalnej celowości systemowej aktualizacji PZPWL 2015 należy stwierdzić, że:

- ze względu na przyjętą elastyczną formułę zapisów dotyczących podstaw realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, dokument PZPWL 2015 nie wymaga zmian – jako formalną podstawę realizacji działań wskazuje się typ dokumentu, nie zaś konkretny dokument.

2. STOPNIENIE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UMIESZCZONYCH W PZPWL 2015

W ramach oceny stopnia realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przyjmuje się formułę:

- **inwestycja zrealizowana** – w odniesieniu do inwestycji zakończonych, które pozwalają na właściwą eksploatację obiektu, infrastruktury, instalacji itp.,
- **inwestycja w realizacji** – w odniesieniu do zadań będących w różnych fazach procesu realizacji, w tym w fazie planistycznej, dokumentacyjnej lub robót budowlanych,
- **inwestycja odroczone** – w odniesieniu do zadań, których realizacja została ustalona / przesunięta na inny termin, w tym zadania znajdujące się na listach rezerwowych,
- **inwestycja zaniechana** – w odniesieniu do zadań, które w procesie planowania rozwoju utraciły zasadność realizacji.

Podstawą oceny stopnia realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym są informacje uzyskane od podmiotów zarządzających systemami infrastrukturalnymi, w tym:

- informacje umieszczone na oficjalnych stronach internetowych instytucji publicznych,
- informacje zawarte w raportach monitoringowych z realizacji poszczególnych planów i programów rozwoju,
- informacje uzyskane w ramach bezpośrednich konsultacji z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadań inwestycyjnych.

2.1. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych, dróg rowerowych oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej

2.1.1. Drogi krajowe

Zadania inwestycyjne umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (*... - przedsięwzięcia uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego)

Tab. 4. Budowa autostrady i dróg ekspresowych (z uwzględnieniem odcinków dróg stanowiących obwodnice miejscowości)

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
1.	A2 na odcinku gr. województwa - Biała Podlaska - Kukuryki - gr. państwa	GDDKiA / Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie, Terespol	Inwestycja w realizacji – gr. województwa - Biała Podlaska Inwestycja w realizacji (w przygotowaniu 2026-2028) – Biała Podlaska - gr. państwa

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
2.	* S 12 gr województwa - Puławy - Kurów - Lublin - Piaski - Dorohusk - gr. Państwa (obwodnica Puław – II etap)	GDDKiA / Puławy (m. i gm.), Końskowola, Piaski, Trawniki, Siedliszcze, Chełm, Kamień, Dorohusk	<p>Inwestycja zrealizowana – na odcinku Puławy - Piaski</p> <p>Inwestycja w realizacji – na odcinku Piaski - gr. państwa</p>
3.	* S 17 gr. województwa - Kurów - Lublin - Piaski - Zamość - Hrebenne - gr. Państwa (obwodnica Tomaszowa Lub.)	GDDKiA / Ryki (m. i gm.), Ułęż, Żyrzyn, Końskowola, Kurów, Markuszów, Garbów, Jastków, Niemce, Wólka, Lublin, Świdnik, Głusk, Mełgiew, Piaski, Fajstławice, Łopiennik Górny, Krasnystaw (m. i gm.), Izbica, Stary Zamość, Zamość, Sitno, Łabunie, Krynice, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski (m. i gm.), Bełżec, Lubycz Królewska	<p>Inwestycja zrealizowana – na odcinku Puławy - Piaski</p> <p>Inwestycja w realizacji – na odcinku Piaski - gr. państwa</p> <p>Inwestycja w realizacji – obwodnica Tomaszowa Lubelskiego</p> <p>Inwestycja odroczone – na odcinku Zamość Południe (bez węzła) - Tomaszów Lubelski Północ (bez węzła) na lata 2023-2025</p>
4.	* S19 gr. województwa - Międzyrzec Podlaski - Lubartów - Lublin - Kraśnik - gr. województwa	GDDKiA / Międzyrzec Podlaski (m. i gm.), Kąkolewnica, Radzyń Podlaski (m. i gm.), Borki, Kock, Firlej, Lubartów (m. i gm.), Niemce, Jastków, Konopnica, Niedzwica Duża, Strzyżewice, Wilkołaz, Kraśnik (m. i gm.), Szastarka, Modliborzyce, Janów Lubelski	<p>Inwestycja w realizacji</p>

Tab. 5. Budowa obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
5.	Gorajca w ciągu drogi nr 74	GDDKiA/Radecznicza	Inwestycja w realizacji (umieszczona w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030)

Nowe zadania inwestycyjne umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025):

- Budowa obwodnicy Chełma / GDDKiA / Chełm (m. i gm.) / zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025.

Nowe zadania inwestycyjne (7 obwodnic w ciągu dróg krajowych o orientacyjnej łącznej długości ok. 49,6 km) umieszczone w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030:

- Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74,
- Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74,
- Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74,
- Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82,
- Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76,
- Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74,
- Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

2.1.2. Drogi wojewódzkie

2.1.2.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa WL

Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029 (*... - przedsięwzięcia uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego)

Tab. 6. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wojewódzkich

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
6.	Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień w ciągu drogi nr 747 wraz z budową dróg dojazdowych	ZDW w Lublinie / Łaziska	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
7.	Rozbudowa drogi nr 747 na odcinku Konopnica - Kamień	ZDW w Lublinie / Konopnica, Bełżyce (m. i gm.), Chodel, Opole Lubelskie, Łaziska	Inwestycja zrealizowana
8.	Rozbudowa drogi nr 835 na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA)	ZDW w Lublinie / Wysokie, Turobin, Chrzanów, Goraj, Frampol (m. i gm.)	Inwestycja zrealizowana
9.	Budowa drogi nr 809 stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (GP)	ZDW w Lublinie / Jastków	Inwestycja zrealizowana
10.	Rozbudowa drogi nr 846 na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km	ZDW w Lublinie / Kraśniczyn, Wojślawice	Inwestycja zrealizowana
11.	Rozbudowa drogi nr 808 na odcinku od km 8+000 do km 20+100 o dł. 12,100 km	ZDW w Lublinie / Łuków, Stanin, Wojcieszków	Inwestycja zrealizowana
12.	Rozbudowa drogi nr 844 na odcinku Witków - granica państwa od km 80+250 do km 88+705,5 o dł. 8,4555 km	ZDW w Lublinie / Dołhobyczów	Inwestycja zrealizowana
13.	Rozbudowa skrzyżowań w m. Okuninka na drodze wojewódzkiej nr 812	ZDW w Lublinie / Włodawa	Inwestycja zrealizowana
14.	Rozbudowa drogi nr 801 na odcinku od granicy woj. lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w miejscowości Puławy o dł. ok. 35 km	ZDW w Lublinie / Puławy (m. i gm.)	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
15.	Rozbudowa drogi nr 829 na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 18,81716 km	ZDW w Lublinie / Łęczna (m. i gm.), Milejów, Trawniki	Inwestycja zrealizowana
16.	Rozbudowa drogi nr 837 na odcinku Nielisz - Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km	ZDW w Lublinie / Nielisz, Zamość	Inwestycja zrealizowana

Zrealizowane zadania inwestycyjne umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2018-2034 (nieujęte w wykazie inwestycji celu publicznego ze względu na ich wprowadzenie w trybie zmiany WPFWL po uchwaleniu PZPWL):

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski w m. Jelnica na odcinku od km 24+000 do km 25+400 o długości 1,400 km / ZDW w Lublinie / Międzyrzec Podlaski (gm.) – oddana do użytku w 2015 roku,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski na odcinku od km 34+245 do km 36+550 / ZDW w Lublinie / Biłgoraj (m. i gm.), Aleksandrów, Józefów, Tomaszów Lubelski – oddana do użytku w 2015 roku,
- droga wojewódzka Nr 874 Zarzecze - Puławy - Przebudowa mostu przez rz. Wisła w m. Puławy / ZDW w Lublinie / Puławy – inwestycja zrealizowana w 2019 roku,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw – rozbudowa drogi na odcinku Korolówka - Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km 74+885 do km ok. 75+150) o długości ok. 4,880 km / ZDW w Lublinie / Włodawa – droga oddana do użytku w 2020 roku,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa - Kębtów – Rozbudowa drogi na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km oraz przebudowa drogi na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok. 4,878 km / ZDW w Lublinie / Bychawa, Jabłonna Pierwsza, Piaski – drogi oddane do użytku odpowiednio w 2019 i 2018 roku).

Nowe zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego przyjętej Uchwałą Nr XXXII/485/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

- rozbudowa drogi Nr 820 (okres realizacji 2022-2023),
- budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice - Nałęczów.

2.1.2.2. Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich WL

Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich umieszczone w Planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012- 2020

Tab. 7. Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
17.	Budowa drogi nr 747 (Solec nad Wisłą) - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica - dojazd do węzła „Konopnica” w ciągu S 19	ZDW w Lublinie / Konopnica	Inwestycja zrealizowana
18.	Rozbudowa drogi nr 809 Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno na odcinku Michów - Przytoczno	ZDW w Lublinie / Michów, Jeziorzany	Inwestycja zrealizowana
19.	Rozbudowa drogi nr 814 Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne od km 6+000 do km 20+928	ZDW w Lublinie / Czemierniki, Wohyń, Siemień	Inwestycja zrealizowana
20.	Rozbudowa drogi nr 815 Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów od km 26+662 do km 61+015	ZDW w Lublinie / Parczew (m. i gm.), Siemień, Ostrówek, Niedźwiada, Lubartów (m. i gm.)	Inwestycja zrealizowana
21.	Rozbudowa drogi nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk – Horodło - Zosin od km 133+ 350 do km 162+616	ZDW w Lublinie / Dubienka, Horodło	Inwestycja zrealizowana
22.	Rozbudowa drogi nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna od km 0+000 do km 29+566	ZDW w Lublinie / Sosnowica, Ludwin, Łęczna (m. i gm.)	Inwestycja w realizacji
23.	Rozbudowa drogi nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice od km 0+067 do km 21+962	ZDW w Lublinie / Lubartów, Spiczyn, Łęczna (m. i gm.)	Inwestycja zrealizowana
24.	Rozbudowa drogi nr 833 Chodel - Kraśnik od km 0+000 do km 26+679	ZDW w Lublinie / Chodel, Urzędów, Kraśnik (m.)	Inwestycja w realizacji

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
25.	Rozbudowa drogi nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - (Sieniawa) na odcinku Piotrków - Wysokie oraz Biłgoraj - gr. województwa	ZDW w Lublinie / Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Biłgoraj, Księżpol, Tarnogród (m. i gm.)	Inwestycja zrealizowana
26.	Rozbudowa drogi nr 838 Głębokie - Dorohucza – Trawniki - Fajstławice od km 15+365 do km 24+797	ZDW w Lublinie / Trawniki, Fajstławice	Inwestycja zrealizowana – na odcinku od ok. 15 + 440km do 18 +570km Inwestycja odroczone – na odcinku od km 18+570 - 24+797 (odc. Trawniki-Fajstławice) – przewidziana do realizacji w latach 2026-2029
27.	Rozbudowa drogi nr 846 Małochwiej Duży – Wojstławice - Teratyn na odcinku od km 0+100 do km 6+100 o dł. 6 km oraz na odcinku od km 6+100 do km 21+393 o dł. 15,293 km	ZDW w Lublinie / Kraśniczyn	Inwestycja zrealizowana
28.	Rozbudowa drogi nr 850 Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów od km 0+042 do km 5+600 oraz od km 8+000 do km 10+200	ZDW w Lublinie / Tomaszów Lubelski (m. i gm.), Tarnawatka, Rachanie	Inwestycja zrealizowana
29.	Rozbudowa drogi nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski (na odcinku 3,5 km na terenie gm. Tomaszów Lubelski)	ZDW w Lublinie / Tomaszów Lubelski	Inwestycja zrealizowana
30.	Budowa drogi nr 867 (Werchrata) - Hrebenne - obejście m. Siedliska	ZDW w Lublinie / Lubycza Królewska	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
31.	Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi nr 830	ZDW w Lublinie / Nałęczów, Wąwolnica	Inwestycja w realizacji (2021-2024)

Nowe zadania inwestycyjne wynikające z Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030, przyjętego Uchwałą Nr CCLXIX/4739/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-2020”:

- budowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy w m. Dęblin wraz z budową mostu (okres realizacji 2020-2024),
- budowa obwodnicy m. Tarnogród leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska (okres realizacji 2021-2024),
- budowa obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków Dołhobyczów - granica państwa (okres realizacji 2021-2024),
- budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie Etap I (okres realizacji 2022-2023),
- budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830. Etap II (okres realizacji 2021-2027),
- budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska – Etap I odcinek droga wojewódzka Nr 812 - DK Nr 2 (okres realizacji 2022-2026),
- budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska – Etap II odcinek DK Nr 2 - węzeł na autostradzie A2 (okres realizacji 2024-2028),
- budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska – Etap III – węzeł na autostradzie A2 - droga wojew. Nr 811 (okres realizacji 2026-2030),
- budowa obwodnicy Biłgoraja w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 (okres realizacji 2024-2030),
- budowa obwodnicy m. Międzyrzec Podlaski leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna (okres realizacji 2022-2027),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońca na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego „Lublin Szerokie” o dł. ok. 2,744 km (okres realizacji 2021-2024),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońca na odcinku od węzła drogowego „Lublin Szerokie” do obwodnicy Nałęczowa o dł. ok. 11,597 km (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku Żuków - Korolówka (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice na odcinku Kijany - Łęczna od km 14+860 do km 21+999 (okres realizacji 2016-2027),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku Rudnik - Wysokie o dł. 30,135 km (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku Wysokie - Krasnystaw – 130 km (okres realizacji 2021-2027),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków – Dołhobyczów - gr. państwa na odcinku Mircze - Witków (okres realizacji 2021-2025),

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków – Dołhobyczów - gr. państwa na odcinku od granicy m. Chełm do m. Białopole (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - gr. państwa na odcinku m. Białopole do m. Mircze (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków – Dołhobyczów - gr. państwa na odcinku m. Białopole do m. Hrubieszów (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn na odcinku gr. województwa - Biłgoraj (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze- Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn na odcinku Biłgoraj - Szczebrzeszyn (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn na odcinku Szczebrzeszyn - Zwierzyniec (okres realizacji 2021-2025),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 oraz do km 19+470 o dł. 9,990 km (okres realizacji 2021-2027),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok 12,550 km (okres realizacji 2021-2027),
- rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy na odcinku Dęblin - Puławy (okres realizacji 2023-2028),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku Gardzienice - Żółkiewka (okres realizacji 2022-2027),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odcinku Żółkiewka - Nielisz (okres realizacji 2023-2029),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski na odcinku Nowy Majdan - Józefów (okres realizacji 2023-2028),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski na odcinku Józefów - Tomaszów Lubelski (okres realizacji 2023-2029),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków (okres realizacji 2023-2028),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów o dł. 48,544 km (okres realizacji 2023-2028),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów na odcinku Jacnia - Józefów (okres realizacji 2024-2028),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów na odcinku Józefów - Wola Obszańska (okres realizacji 2024-2029),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol odcinek Kolczyn - Annopol (okres realizacji 2026-2029),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów na odcinku od granicy województwa do Tarnogrodu (okres realizacji 2026-2030),
- rozbudowa Drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów na odcinku od Tarnogrodu do granic województwa (okres realizacji 2026-2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka - droga Nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa (okres realizacji 2020-2021),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 851 od drogi wojewódzkiej Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda (okres realizacji 2020-2021),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 830 do stacji kolejowej Sadurki Małe (okres realizacji 2022-2023),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 741 na odcinku od drogi nr 738 do rzeki Wisły (okres realizacji 2022-2023),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 828 w m. Niemce (okres realizacji 2021-2024),

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku Kukawka - Teratyn (okres realizacji po 2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm Rejowiec - Krasnystaw na odcinku Wisznice - Żuków (okres realizacji po 2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol odcinek Bochoznica - Pustelnia (okres realizacji po 2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość na odcinku Chełm - Wólka Kraśniczyńska (okres realizacji po 2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość na odcinku Stara Wieś - Zamość (okres realizacji po 2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 809 na odcinku Michów - Krasienin (okres realizacji po 2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin na odcinku Dorohusk - Zosin (okres realizacji po 2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 811 Sarnaki - Konstantynów - Biała Podlaska na odcinku gr. Województwa - Biała Podlaska (okres realizacji po 2030),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw od km 75+700 do km 99+436 na odcinku Włodawa - Łowcza (okres realizacji po 2030).

Trwają prace nad projektem Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040 roku) (inaczej Plan Transportowy), w ramach którego wskazuje się 26 regionalnych inwestycji transportowych, planowanych do realizacji w obecnej perspektywie programowania.

2.1.2.3. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego

Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego

Tab. 8. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wojewódzkich

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
32.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin- Wysokie, 33,148	ZDW w Lublinie / Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie	Inwestycja zrealizowana
33.	Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu DK nr 19 na odcinku Radawiec Duży- węzeł Konopnica	ZDW w Lublinie / Konopnica	Inwestycja zrealizowana

2.1.3. Trasy rowerowe

Zadania inwestycyjne w zakresie tras rowerowych umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029

Tab. 9. Trasy rowerowe

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
34.	Budowa trasy rowerowej w Polsce Wschodniej	ZDW w Lublinie / Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno, Zalesie, Terespol, Kodeń, Sławatycze, Hanna, Włodawa, Wola Uhruska, Ruda- Huta, Chełm, Siennica Różana, Krasnystaw, Izbica, Nielisz, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Susiec	Inwestycja zrealizowana

2.1.4. Teleinformatyka

Zadania inwestycyjne w zakresie teleinformatyki umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029

Tab. 10. Teleinformatyka

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
35.	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej	Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości / Obszar województwa	Inwestycja zrealizowana

2.2. Budowa, rozbudowa i przebudowa linii kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zadania inwestycyjne umieszczone w Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r., Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2015 oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030) (*... - przedsięwzięcia uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego)

Tab. 11. Modernizacja linii kolejowych

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
36.	* Nr 2/E20, C-E20 Warszawa Terespol - gr. Państwa z dostosowaniem do prędkości 141-160 km/h	PKP PLK S.A. / Łuków (m. i gm.), Trzebieszów, Międzyrzec Podlaski (m. i gm.), Drelów, Biała Podlaska (m. i gm.), Zalesie, Piszczac, Terespol (m. i gm.)	Inwestycja w realizacji w ramach projektów pn.: – „Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III (prace przygotowawcze)”, – „Modernizacja linii kolejowej E 20/C–E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II (planowane zakończenie – 2023 rok)”, – „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol (planowane zakończenie – 2024 rok)”.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
37.	* Nr 7/ C28 Warszawa - Lublin z dostosowaniem do prędkości 120-160 km/h	PKP PLK S.A. / Stężyca, Dęblin, Puławy (m. i gm.), Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Jastków, Konopnica, Lublin	Inwestycja w realizacji, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Zakończono prace przewidziane do realizacji w zakresie branży torowej i energetycznej oraz związane z zabudową podstawowej warstwy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Otwock - Lublin zostały (aktualnie prowadzone są odbiory końcowe w zakresie tej branży), - Trwają prace związane z zaprojektowaniem i zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nowo wybudowanej łącznicy kolejowej nr 588 (łączy linię kolejową nr 7 oraz nr 68) oraz systemu ETCS L2 na całym modernizowanym odcinku linii, - Modernizacja linii kolejowej na odcinku Otwock - Lublin (prace przygotowawcze, planowane zakończenie robót w ramach etapu I - 2023 r.).
38.	Nr 7/ C28 na odcinku Lublin – Chełm - Dorohusk z dostosowaniem do prędkości 101-120 km/h	PKP PLK S.A. / Lublin, Świdnik, Mełgiew, Milejów, Trawniki, Rejowiec Fabryczny (m. i gm.), Rejowiec, Chełm (m. i gm.), Dorohusk	Inwestycja zrealizowana (2019r.)
39.	Nr 12/C-E20 Skierniewice - Łuków z dostosowaniem do prędkości 101-120 km/h	PKP PLK S.A. / Stoczek Łukowski (m. i gm.), Stanin, Łuków (m. i gm.)	Inwestycja odroczone – rozważana do realizacji w latach 2021-2027 (opracowywana została dokumentacja projektowa)

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
40.	Nr 450 Kobylany-Wólka w stacji Małaszewicze	PKP PLK S.A. / Terespol, Zalesie	Inwestycja odroczone – umieszczona na liście zadań rezerwowych WPIK
41.	Nr 68 na odcinku Lublin - Stalowa Wola - Rozwadów wraz z elektryfikacją	PKP PLK S.A. / Lublin, Niedrzwica Duża, Wilkołaz, Kraśnik (m. i gm.), Zakrzówek, Szastarka, Trzydnik Duży, Potok Wielki	Inwestycja zrealizowana pn.: – Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją (2020 r.).
42.	* Nr 30 na odcinku Parczew - Łuków	PKP PLK S.A. / Parczew (m. i gm.), Milanów, Wołyń, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat, Łuków (m. i gm.)	Inwestycja zrealizowana (2019 r.)

Tab. 12. Modernizacja mostów

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
43.	Most w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol	PKP PLK S.A. / Terespol	Inwestycja zrealizowana

Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego

Tab. 13. Modernizacja linii kolejowych

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
44.	Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów - Parczew	PKP PLK S.A. / Lubartów, Niedźwiada, Siemień, Parczew	Inwestycja w realizacji (planowane zakończenie projektu w 2023 r.)
45.	Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec - Hrebenne	PKP PLK S.A. / Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Krasnystaw, Izbica, Nielisz, Zamość, Zwierzyniec, Józefów, Susiec, Bełzec, Lubycza Królewska	Inwestycja odroczone – rozważana do realizacji w latach 2021-2027 (dla odcinka Rejowiec - Zawada opracowano dokumentację przedprojektową w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada”)
46.	Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość - Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada - Zamość)	PKP PLK S.A. / Zamość	Inwestycja odroczone – rozważana do realizacji w latach 2021-2027 (dla odcinka Zawada - Zamość opracowano dokumentację przedprojektową w ramach projektu pn „Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada).
47.	Budowa Kolejowego terminala Przeładunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełma	PKP PLK S.A. / Chełm	Inwestycja odroczone – budowa uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania (w perspektywie do 2023 r.)

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
48.	Budowa terminala przeładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość - Bortatycze LHS oraz stacji Zamość- Majdan	PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. / Zamość	W realizacji (inwestycja jest częścią większego projektu pn. „Budowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych)

Zadania inwestycyjne ujęte w dokumencie pn. „PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”

Projekty ponadregionalne:

- Prace na linii kolejowej C–E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków,
- Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, Etap I – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol,
- Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, etap II – Budowa nowego mostu na rzece Bug wraz z włączeniem do układu torowego o prześwicie 1520 mm i 1435 mm stacji Terespol,
- Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin Północny wraz z elektryfikacją,
- Stworzenie nowego ciągu transportowego (Lublin) - Kraśnik - Ożarów - Opatów - Daleszyce - Sitkówka Nowiny - (Kielce).

Projekty regionalne:

- Prace na linii kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada,
- Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa lubelskiego,
- Rewitalizacja połączenia (Stalowa Wola) - Zawada - Zamość - Hrubieszów,
- Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa,
- Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin,
- Lubelska Kolej Aglomeracyjna,
- Przebudowa urządzeń SRK wraz z układem torowym na stacji Zawadówka,
- Prace na linii kolejowej nr 69 na odcinku Zawada - Zwierzyniec Tow. - Hrebenne,
- Stworzenie ciągu Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj.

2.3. Budowa i rozbudowa przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, gazów i energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.3.1. Elektroenergetyka

Zadania inwestycyjne umieszczone w KPZK 2030 – na podstawie Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną

Tab. 14. Elektroenergetyka

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
49.	Budowa linii 400 kV relacji Kozienice - Siedlce Ujżanów	PSE SA / Łuków, Stoczek Łukowski	Inwestycja zrealizowana w 2018 r.
50.	Budowa 2- torowej linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa	PSE SA / Chełm, Wierzbica, Siedliszcze, Cyców, Puchaczów, m. Łęczna, Łęczna, Spiczyn, Niemce, Wólka	Inwestycja w realizacji (2016-2022)
51.	Budowa linii 400 kV Chełm – Mokre - Jarosław	PSE SA / Chełm, Siennica Różana, Krańciczyn, Skierbieszów, Izbica, Stary Zamość, Zamość, Łabunie, Krynice, Tarnawatka, Krasnobród, Tomaszów Lubelski, Susiec	Inwestycja zaniechana
52.	Rozbudowa stacji Chełm (220/110 kV o pole 400 kV)	PSE SA / Chełm	Inwestycja w realizacji Zakończenie zadania planowane jest w 2023 r.
53.	Rozbudowa stacji Puławy (według Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010- 2025 inwestycja określona jest jako Budowa stacji 400/220 kV Puławy)	PSE SA / Puławy	Inwestycja odroczone Inwestycja planowana w latach 2026-2028 pn. „Rozbudowa stacji 220 kV Puławy dla przyłączenia bloku Grupy Azoty Zakładów Azotowych "PUŁAWY" S.A.”

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
54.	Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa związana z wprowadzeniem linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa oraz realizacją inwestycji związanej z przyłączeniem bloku Elektrowni Łęczna	PSE SA / Niemce	Inwestycja częściowo w realizacji – Zakończenie rozbudowy stacji 400/110 kV Lublin Systemowa związanej z wprowadzeniem linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa planowane jest w roku 2025. Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa dla przyłączenia bloku El. Łęczna planowana jest w latach 2026-2028.
55.	Budowa linii 220 kV Lublin Systemowa - Abramowice	PSE SA / Lublin, Niemce	Inwestycja zaniechana
56.	Linia Lublin Wschód - Lublin Systemowa	PSE SA / Puchaczów, Łęczna, Spiczyn, Niemce, Wólka, Lublin	Inwestycja zaniechana
57.	Budowa stacji Lublin Wschód	PSE SA / Okolice Łęcznej	Inwestycja zaniechana

Zadania inwestycyjne umieszczone w zaktualizowanym (w lutym 2014 r.) Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025 (nieujęte w PZPWL 2015):

- Budowa linii 400 kV od stacji Puławy do nacięcia linii Kozienice - Lublin Systemowa/ PSE S.A./ inwestycja zaniechana,
- Budowa linii 400 kV od stacji Puławy do nacięcia linii Kozienice - Ostrowiec /PSE S.A./ inwestycja zaniechana,
- Modernizacja stacji 220/110 kV Mokre /PSE S.A./ inwestycja zrealizowana.

Nowe zadania inwestycyjne umieszczone w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 oraz w projekcie Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032:

- Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość /PSE SA/Zamość/ – inwestycja w realizacji, zakończenie zadania planowane jest w roku 2026,
- Modernizacja linii 220 kV Abramowice-Puławy /PSE SA/Puławy, Końskowola, Kurów, Markuszów, Garbów, Jastków, Konopnica, Lublin – inwestycja w realizacji, zakończenie zadania planowane jest w roku 2025,
- Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa /PSE SA/ Niemce – inwestycja w realizacji, zakończenie rozbudowy stacji 400/110 kV Lublin Systemowa związanej z wprowadzeniem linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa oraz instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej planowane jest w roku 2025,
- Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa dla przyłączenia bloku El. Łączna /PSE SA /Niemce – inwestycja planowana jest w latach 2026-2028,
- Rozbudowa stacji 220/110 kV Chełm (wraz z wymianą transformatora 220/110 kV oraz instalacją transformatora 400/220 kV) /PSE SA /Chełm – inwestycja w realizacji (2017-2023),
- Rozbudowa stacji 220 kV Puławy dla przyłączenia bloku Grupy Azoty Zakładów Azotowych "PUŁAWY" S.A. /PSE. S.A./Puławy – Inwestycja planowana jest w latach 2026-2028,
- Wymiana przewodu odgromowego OPGW na liniach 220 kV: Puławy - Abramowice, Kozienice - Puławy /PSE SA/Puławy, Końskowola, Kurów, Markuszów, Garbów, Jastków, Konopnica, Lublin – inwestycja w realizacji (2018-2022),
- Dostosowanie stacji Abramowice, Mokre i Zamość do wymogów Rozporządzenia Komisji UE z dnia 24 listopada 2017 dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemu elektroenergetycznego /PSE SA/Lublin, Zamość – inwestycja w realizacji (2019-2027),
- Rozbudowa oraz modernizacja Systemu Ochrony Technicznej dla stacji Abramowice /PSE SA/Lublin – inwestycja planowana jest w latach 2022-2025,
- Rozbudowa stacji 220/110 kV Mokre dla wprowadzenia linii abonenckiej 220 kV (zasilanie PT Siedliska) /PSE SA/Zamość - Inwestycja planowana jest w latach 2033-2035.

Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontakcie Terytorialnym:

- Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa - Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona
- Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz. 1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW: projekt w trakcie realizacji.

Wykaz kluczowych zamierzeń inwestycyjnych wpisanych do PZPW 2015 na obszarze województwa lubelskiego dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej:

- **w zakresie budowy linii 110 kV:**
 - Kock - Michów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja w realizacji. Inwestycja w trakcie prac projektowych – uzyskana decyzja środowiskowa, przewidywany termin realizacji 2026.
 - Elektrownia Puławy - Michów - Lubartów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od budowy elektrowni w Puławach w zakresie linii Puławy - Michów. Nie przewiduje się budowy linii Michów - Lubartów ze względu na zmianę koncepcji.
 - Elektrownia Puławy - Garbów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od budowy elektrowni w Puławach w zakresie linii Puławy - Kurów. Zmiana koncepcji i procedowanie relacji Garbów - Kurów - Klementowice.

- Ryki - Michów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Kozienice - Dęblin /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Kazimierz - Poniatowa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zaniechana. Odstąpiono od relacji Kazimierz - Poniatowa. Procedowana jest zmiana koncepcji na linię Opole - Zagłoba - Kazimierz.
- stacja Zagłoba - wpięcie w planowaną linię 110 kV relacji Kazimierz - Poniatowa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zaniechana. Odstąpiono od relacji Kazimierz - Poniatowa. Procedowana jest zmiana koncepcji na linię Opole - Zagłoba - Kazimierz.
- Garbów - Nałęczów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zaniechana.
- Lubartów - Lubartów Południe - Lubartów Wschód - /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej. Zmiana koncepcji i nazw planowanych stacji. Stacja Lubartów Południe planowana jest do wpięcia w ciąg Lubartów - Lublin 400. Planowana realizacja linii Lubartów Południe - Lubartów Wschód.
- Leszkowice - Lubartów Wschód /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- stacja Lubartów Wschód - Stacja Ostrów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- stacja Leszkowice – wpięcie w linię 110 kV relacji Lublin Systemowa - Parczew /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- stacja Ostrów – wpięcie w linię 110 kV relacji Lublin Systemowa - Parczew /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana.
- stacja Chruślina – wpięcie w linię 110 kV relacji Opole Lubelskie /Budzyń PGE Dystrybucja S.A. wykonawca ENERTEL/ Inwestycja zrealizowana.
- Annopol - Budzyń /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów/ Inwestycja w realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowywanie wniosku do Zarządu oraz Rady Nadzorczej przez Oddział Lublin (realizacja 2023).
- stacja Polichna (planowana) – wpięcie w linię 110 kV relacji Zaklików - Budzyń /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów/ Inwestycja zrealizowana w 2021 r.
- stacja Krzywda – wpięcie w linię relacji Łuków - Stoczek Łukowski (linia 2-torowa) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa/ Inwestycja odroczone. Planowana po 2028 r.
- Radzyń Podlaski - Międzyrzec Podlaski /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem

zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.

- Chełm Cementownia - Dorohusk /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. I etap Chełm - Chełm Cementownia realizacja IV kw. 2023, II etap Chełm Cementownia - Dorohusk IV kw. 2026.
- Wojsławice - Dorohusk /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/
- Wojsławice - Hrubieszów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ b.d.
- Poturzyn - Dobrotwór (Ukraina) lub wariantowo Tyszowce - Dobrotwór /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zaniechana.
- Dobrotwór (Ukraina) - Ulhówek /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zaniechana.
- Tyszowce - Ulhówek /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ inwestycja zrealizowana w 2020 r.
- Józefów - Tarnogród /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji 2034-2035.
- Biskupice - Stryjno /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Bychawa - Stryjno /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Lublin Pancerniaków - Lublin Elektrownia /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Elektrownia - Działkowa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Wschód - Działkowa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Czechów - Solidarności /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Prusa - Działkowa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- stacja Węglin – wpięcie w linię 110 kV relacji Abramowice - Bełżyce /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Termin realizacji po 2028 r.
- stacja Niedrzwica – wpięcie w linię 110 kV relacji Abramowice - Bychawa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.

- Józefów - Lubaczów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji 2028-2029.
- stacja Cyców – wpięcie w linię Chełm - Nadrybie (linia 2-torowa) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji 2022-2023.
- stacja Frampol – wpięcie w linię Żółkiewka - Janów Lubelski (linia 2-torowa) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zaniechana. Zrezygnowano z realizacji na rzecz rozbudowy rozdzielni Dzwola.
- **w zakresie modernizacji linii 110 kV:**
 - Biłgoraj - Szczebrzeszyn - Zamość Mokre /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zrealizowana na odcinku: Biłgoraj - Szczebrzeszyn.
 - Tomaszów Płd. - Lubaczów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji IV kw. 2027
 - Nisko - Biłgoraj - Szczebrzeszyn - Mokre - Zamość /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zrealizowana częściowo. Nisko - Biłgoraj – I etap zakończony w III 2021 r. Biłgoraj - Szczebrzeszyn – inwestycja zrealizowana w 2020 r. Mokre - Zamość - inwestycja zrealizowana w 2021 r. Nisko - Biłgoraj – II etap IV kw. 2023 r.
 - Zamość - Tomaszów Płn. - Tomaszów Płd. /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. I etap – Tomaszów Płn. - Tomaszów Płd. – IV kw. 2025, II etap – Zamość - Tomaszów Płn. – IV kw. 2029.
 - Chełm Systemowa - Macoszyn - Włodawa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji 2029-2030
 - Zaklików - Budzyń – Inwestycja odroczone. Wybudowano GPZ Polichna (dla PKP) i powstały dwie nowe relacje. Modernizacja linii przewidywana jest w etapach w latach 2023-2029.
- **w zakresie budowy stacji 110/15 kV:**
 - Michów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji po 2025 r.
 - Nowodwór – Inwestycja zaniechana.
 - Jeziorzany – Inwestycja zaniechana.
 - Lubartów Wschód /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
 - Leszkowice /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
 - Chruślina /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana w 2019 r.
 - Polichna /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów/ Inwestycja zrealizowana w 2021 r.
 - Frampol /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji IV kw. 2025
 - Krzywda – b.d.
 - Ostrów Lubelski /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana.
 - Cyców /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. planowany termin realizacji 2022-2023
 - Dorohusk /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. planowany termin realizacji 2025-2026
 - Wojślawice /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji 2031-2032

- Stryjno /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Osmolice /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Konopnica /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Dębówka /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Rudnik /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Felin /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. planowany termin realizacji 2022
- Helenów – b.d.
- Dąbrowa – b.d.
- Lublin Pancerniaków /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Działkowa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Prusa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Niedrzwica /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Niemce /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. planowany termin realizacji 2024
- Zagłoba /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. planowany termin realizacji 2028
- **w zakresie rozbudowy i modernizacji stacji 110/15 kV:**
 - Ryki /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
 - Kock /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.

- Dęblin /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Kazimierz /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Nałęczów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana.
- Klementowice /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana.
- Budzyń (110/30/15 kV) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana.
- Poniatowa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana.
- Annopol – b.d.
- Radzyń Podlaski /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Międzyrzec Podlaski /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja odroczone. Zadanie przewidywane jest do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Uruchomienie zadania związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, oraz rozwoju energetyki odnawialnej.
- Wólka Dobryńska /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja w realizacji. W trakcie realizacji w zakresie dobudowy pola WN na potrzeby przyłączenia FW, zakończenie 2022.
- Wisznice /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana. Zrealizowane w 2022 w zakresie dobudowy pola dla FW
- Hrubieszów Płn. PGE /Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji 2032.
- Ułhówek /Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zrealizowana w 2020 r.
- Tyszowce /Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zrealizowana w 2020 r.
- Józefów /Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji 2028 – 2029.
- Tarnogród /Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja odroczone. Planowany termin realizacji 2035.
- Biłgoraj /Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zrealizowana w 2014 r. Dotyczy stacji Biłgoraj Południe.
- Zamość Majdan /Dystrybucja S.A. Oddział Zamość/ Inwestycja zrealizowana w 2013 r.
- Świdnik /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana.
- Lublin - Dziesiąta /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja zrealizowana w 2016 r.
- Łuków (110/30/15 kV) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa/ Inwestycja zrealizowana w 2016 r.
- Stoczek Łukowski /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa/ Inwestycja zrealizowana w 2019 r.

Zadania planowane po 2028 roku w zakresie budowy linii 110 kV:

- Budowa linii 110 kV Adamowo - Hołowczyce /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa dwutorowej linii 110 kV relacji Radzyń – Radzyń Przemysłowa (2) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

- Budowa linii 110 kV relacji Międzyrzec - Krzewica / PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa linii 110 kV relacji Wisznice - Międzyże - Piszczac /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Wpięcie w linię 110 kV Budzyń - Polichna (podejście do GPZ Kraśnik) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Wpięcie w linię 110 kV Budzyń - Annopol (podejście do GPZ Kraśnik Fabryczny) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa linii 110 kV Garbów - Kurów - Klementowice /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa linii 110 kV Garbów - Michów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa linii 110 kV Elektrownia - Felin /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Wpięcie w linię 110 kV Łęczna - Bogdanka (podejście do GPZ Łęczna Wschód) /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

Zadania planowane po 2028 roku w zakresie budowy stacji 110 kV:

- Rozbudowa GPZ Piszczac /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- GPZ Radzyń Przemysłowa /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Kraśnik /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Wiski /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Huszlew /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Kąkolewnica /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa GPZ Międzyrzec Zachód /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa GPZ Biała Podlaska Francuska /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa GPZ Międzyże /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Kurów /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Kraśnik Fabryczny /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Rzeczyca /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Zawieprzycze /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
- Budowa stacji 110/15 kV Międzyże
- Budowa stacji 110/15 kV Krzewica /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.

Nowe inwestycje celu publicznego w zakresie dystrybucji sieci elektroenergetycznej wg Listy projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

- Rozbudowa GPZ Wilkołaz /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja w realizacji. Planowany termin zakończenia 2022.
- Przebudowa GPZ Abramowice /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja w realizacji. Planowany termin zakończenia 2023.
- Przebudowa GPZ Felin /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja w realizacji. Planowany termin zakończenia 2022.
- Budowa linii 110 kV relacji Annopol - Budzyń /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja w realizacji. Planowany termin zakończenia 2023.
- Modernizacja stacji 220/110/15 kV Zamość /PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin/ Inwestycja w realizacji. Planowany termin zakończenia II kw. 2024.

Inwestycje celu publicznego w zakresie dystrybucji sieci elektroenergetycznej należące do zadań PKP Energetyka Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej:

- Modernizacja Układu Zasilania Sieci Trakcyjnej w Terespolu (Podstacja Trakcyjna Terespol), planowana realizacja – I kw. 2020 - III kw. 2023 r.

- Modernizacja Układu Zasilania Sieci Trakcyjnej w Małaszewiczach (Podstacja Trakcyjna Małaszewicze), planowana realizacja – I kw. 2020 - III kw. 2023 r.
- Modernizacja Układu Zasilania Sieci Trakcyjnej w Motyczu (Podstacja Trakcyjna Motycz), planowana realizacja – I kw. 2020 - IV kw. 2023 r.
- Modernizacja Linii Potrzeb Nietrakcyjnych Rejowiec - Żulin, planowana realizacja – I kw. 2020 - IV kw. 2022 r.

2.3.2. Paliwa energetyczne

Zadania inwestycyjne umieszczone w KPZK 2030 – na podstawie Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego

Tab. 15. Gospodarka paliwowa

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
58.	Rozbudowa Krajowej sieci przesyłu gazu DN 700 Rozwadów – Końskowola - Wronów	GAZ - System SA / Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Poniatowa, Wojciechów, Bełżyce, Chodel, Urzędów, Dzierzkowice, Kraśnik, Trzydnik Duży	Inwestycja odroczone – inwestycja w perspektywie 2029 roku
59.	Rozbudowa krajowej sieci przesyłu gazu DN 500 Wronów - Rembelszczyzna	GAZ - System SA / Końskowola, Żyrzyn, Ułęż, Ryki	Inwestycja zrealizowana
60.	Rozbudowa węzła Wronów	GAZ - System SA / Końskowola	Inwestycja zrealizowana
61.	Budowa ropociągu surowcowego relacji Brody - Płock, jako rozwijanie sieci TEN-E, rozbudowa systemu przesyłu surowców naftowych – (Inter Mare) Odessa - Brody - Gdańsk	Sarmatia sp. z o.o. / Horodło, Hrubieszów, Uchanie, Wojsławice, Leśniowice, Siennica Różana, Krasnystaw, Łopiennik górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Puchaczów, Łęczna, Ludwin, Ostrów Lubelski, Serniki, Niedźwiada, Siemień, Milanów, Wohyń, Komarówka Podlaska, Łomazy, Biała Podlaska, Konstantynów	Inwestycja odroczone – brak finansowania

Zadania inwestycyjne nieujęte w PZPWL 2015 – na podstawie Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego - Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2014-2023 (Gaz – System):

- Budowa gazociągu DN 700 Wronów - Rembelszczyzna na odcinku od węzła Wronów do granicy województwa, L=26 km – planowany termin realizacji 2019-2023
- Budowa gazociągu DN 500 Wronów – Kozienice, na odcinku od Wronowa do granicy województwa, L=14 km – planowany termin realizacji 2014-2018
- Budowa gazociągu DN 1000 Rozwadów - Końskowola - Wronów na odcinku od granicy województwa węzła Wronów, L=103 km – planowany termin realizacji 2019-2023
- Modernizacja tłoczni Wronów – realizacja 2014-2018
- Przebudowa węzła Felin – realizacja 2014-2018
- Przebudowa SRP Płonki – realizacja 2014-2018
- Przebudowa SRP Nałęczów – realizacja 2014-2018
- Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej na obszarze gmin Annopol i Gościeradów – realizacja 2014-2018

Nowe zadania inwestycyjne nieujęte w PZPWL 2015 – na podstawie Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego - Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2018-2027 (Gaz – System):

- Gazociąg DN 1000 Wola Karczewska - Wronów – realizacja 2023-2027

Nowe zadania inwestycyjne nieujęte w PZPWL 2015 – na podstawie Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego - Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020-2029 (Gaz – System):

- Warszawa Północ - Wronów – perspektywa do 2029 r.

Nowe zadania inwestycyjne – na podstawie Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego - Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2022-2031 (Gaz – System):

- Układ łączący korytarz C-E z korytarzem N-S – perspektywa do 2031 r.
- Gazociąg Gustorzyn - Wronów – perspektywa do 2024 r.

Plan Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na lata 2022-2026 pn. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2022-2026 nie przewiduje zadań dotyczących gazociągów na wysokim ciśnieniu o znaczeniu ponadlokalnym zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. PSG planuje budowę sieci dystrybucyjnej o gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 315 o długości 16 400 m na terenie powiatu lubartowskiego.

2.4. Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznych urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania

2.4.1. Infrastruktura oczyszczania i odprowadzania ścieków

Zadania inwestycyjne umieszczone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (IV aktualizacja)

Tab. 16. Budowa oczyszczalni ścieków (wg gmin wiodących w aglomeracjach)

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania ¹
62.	Dębowa Kłoda	JST	Inwestycja zrealizowana
	Gościeradów	JST	Inwestycja zaniechana
	Jeziorzany	JST	Inwestycja zrealizowana
	Kurów	JST	Inwestycja zrealizowana
	Milanów	JST	Inwestycja zrealizowana
	Niedzwica Duża	JST	Inwestycja zrealizowana
	Niedźwiada	JST	Inwestycja zrealizowana
	Potok Wielki	JST	Inwestycja zaniechana – zmiana koncepcji na oczyszczalnie przydomowe
	Rossosz	JST	Inwestycja zaniechana – likwidacja aglomeracji

¹ Na podstawie raportów gmin na obszarze których zadanie było realizowane (BIP) oraz informacji umieszczonych na stronach internetowych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania (w tym: WOD-KAN Biała Podlaska, ZZO we Włodawie, ZZO w Wincentowie, ZZO KOM-EKO Lublin, Urząd Miasta Lublin, Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Srebrzyszcze, PGK sp. z o.o. w Biłgoraju).

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania ¹
	Trzydnik Duży	JST	Inwestycja zaniechana – zmiana koncepcji na oczyszczalnię przydomowe
	Ulan-Majorat	JST	Inwestycja zrealizowana
	Uścimów	JST	Inwestycja zrealizowana
	Wołyń	JST	Inwestycja zrealizowana

Tab. 17. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania ²
63.	Adamów	JST	Inwestycja zrealizowana
	Bełżec	JST	Inwestycja zrealizowana
	Bełżyce	JST	Inwestycja zrealizowana
	Biała Podlaska	JST	Inwestycja w realizacji

² Na podstawie raportów gmin na obszarze których zadanie było realizowane (BIP) oraz informacji umieszczonych na stronach internetowych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania (w tym: WOD-KAN Biała Podlaska, ZZO we Włodawie, ZZO w Wincentowie, ZZO KOM-EKO Lublin, Urząd Miasta Lublin, Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Srebrzyszcze, PGK sp. z o.o. w Biłgoraju).

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania ²
	Bychawa	JST	Inwestycja zrealizowana
	Chełm	JST	Inwestycja zrealizowana
	Czemierniki	JST	Inwestycja zrealizowana
	Frampol	JST	Inwestycja zrealizowana
	Hrubieszów	JST	Inwestycja zrealizowana
	Janów Lubelski	JST	Inwestycja zrealizowana
	Kamionka	JST	Inwestycja zrealizowana
	Kazimierz Dolny	JST	Inwestycja zrealizowana
	Kock	JST	Inwestycja zrealizowana
	Komarówka Podlaska	JST	Inwestycja zaniechana – likwidacja aglomeracji, dla której miała być zrealizowana inwestycja – 2014
	Konstantynów	JST	Inwestycja odroczone

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania ²
	Krasnobród	JST	Inwestycja zrealizowana
	Kraśnik	JST	Inwestycja zrealizowana
	Międzyrzec Podlaski	JST	Inwestycja zrealizowana
	Milejów	JST	Inwestycja zrealizowana
	Modliborzyce	JST	Inwestycja zrealizowana
	Nałęczów	JST	Inwestycja zrealizowana
	Niemce	JST	Inwestycja zrealizowana
	Obsza	JST	Inwestycja zrealizowana
	Piaski	JST	Inwestycja zrealizowana
	Puchaczów	JST	Inwestycja zrealizowana
	Puławy	JST	Inwestycja zrealizowana
	Radzyń Podlaski	JST	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania ²
	Rejowiec	JST	Inwestycja zrealizowana
	Ryki	JST	Inwestycja zrealizowana
	Serniki	JST	Inwestycja zrealizowana
	Stanin	JST	Inwestycja zaniechana – zmiana koncepcji na oczyszczalnię przydomowe
	Stoczek Łukowski	JST	Inwestycja zrealizowana
	Strzyżewice	JST	Inwestycja zrealizowana
	Tarnogród	JST	Inwestycja zrealizowana
	Terespol	JST	Inwestycja zrealizowana
	Tereszpol	JST	Inwestycja zrealizowana
	Trawniki	JST	Inwestycja zrealizowana
	Trzebieszów	JST	Inwestycja w realizacji
	Werbkowice	JST	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania ²
	Wierzbica	JST	Inwestycja zrealizowana
	Włodawa	JST	Inwestycja zrealizowana
	Wojcieszków	JST	Inwestycja zrealizowana
	Wola Uhruska	JST	Inwestycja zrealizowana
	Zwierzyniec	JST	Inwestycja zrealizowana

Zadania inwestycyjne umieszczone w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2017 (V aktualizacja) – nieujęte w PZPWL 2015

31 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK, w którym wskazano listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021:

- **Inwestycje zrealizowane** – obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w ramach AKPOŚK 2017 (wg gmin wiodących w aglomeracjach): Adamów, Anopol (zaniechano budowy nowej oczyszczalni), Bełżec, Bychawa, Dęblin, Firlej (budowa nowej oczyszczalni), Garbów, Gościeradów (zaniechano budowy nowej oczyszczalni), Jastków, Krasnobród, Krasnystaw, Kraśnik, Łuków, Niedzwica Duża, Obsza, Ostrów Lubelski, Piaski, Strzyżewice (Pszczela Wola, Piotrowice) - zaniechano budowy nowej oczyszczalni, Stoczek Łukowski (Wola Kisielska), Tarnogród (zaniechano budowy nowej oczyszczalni), Wąwolnica (zaniechano budowy nowej oczyszczalni), Terespol, Wola Uhruska, Zamość.
- **Inwestycje w trakcie realizacji** – obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w ramach AKPOŚK 2017 (wg gmin wiodących w aglomeracjach): m. Biała Podlaska, Lublin.
- **Inwestycje odroczone** – obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w ramach AKPOŚK 2017 (wg gmin wiodących w aglomeracjach): Bełżyce, Biłgoraj, Biszczka, Hrubieszów, Frampol, Józefów, Konstantynów, Milejów, Opole Lubelskie, Ryki, Tomaszów Lubelski, Włodawa.
- **Inwestycje zaniechane** – Karczmiska, Nałęczów, Puchaczów, Wojcieszków.

Inwestycje w ramach projektu VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2021) obejmujące rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków (wg gmin wiodących w aglomeracjach):

m. Zamość, m. Chełm, m. Ryki, Puławy, Międzyrzec Podlaski, Miasto Krasnystaw, Janów Lubelski, m. Radzyń Podlaski, Terespol, Zwierzyniec, Stoczek Łukowski, Niedzwica Duża, Wisznice, Kazimierz Dolny, Trawniki, Trzebieszów, Potok Górny, Wierzbica, Wohyń, Tarnawatka, Urszulin, Tarnogród, Urzędów, Zakrzówek, Uścimów (Jedlanka), Łukowa.

2.4.2. Infrastruktura odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zadania inwestycyjne umieszczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017

Tab. 18. Gospodarka odpadami

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
64.	Budowa / rozbudowa stacji przeładunkowych	WOD-KAN Biała Podlaska, gminy / Region Biała Podlaska	Inwestycja zaniechana Inwestycja nie została zaplanowana i zgłoszona przez Zakład w aktualizacji planu tj. w WPGO 2022*
65.	Budowa / rozbudowa składowiska odpadów	WOD-KAN Biała Podlaska, gminy/ Region Biała Podlaska	Inwestycja zrealizowana
		ZZO w Wincentowie, ZZO we Włodawie, PGKiM sp z.o.o. Łęczna / Region Centralno-Wschodni	Inwestycja zrealizowana
		Miasto Lublin / Region Centralny	Inwestycja zrealizowana
		ZPOK Srebrzyszcze / Region Chełm	Inwestycja zrealizowana
		ZZO Kraśnik, ZZO w Bełżycach / Region Południowo-Zachodni	Inwestycja zrealizowana
		PGK sp. z.o.o. w Biłgoraju / Region Południowy	Inwestycja zrealizowana
		ZZO m. Łasków, ZZO w m. Rogóźno, PGK sp. z.o.o. w Biłgoraju / Region Południowy	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
		ZZO „Adamki” gm. Radzyń Podlaski / Region Północno-Zachodni	Inwestycja w realizacji Rozbudowę składowiska uwzględniono w WPGO 2022.
		ZUK Puławy / Region Puławy	Inwestycja zrealizowana
66.	Budowa / rozbudowa instalacji sortowania odpadów	ZZO we Włodawie / Region Centralno-Wschodni	Inwestycja zrealizowana
67.	Budowa / rozbudowa instalacji przekształcania odpadów	PGKiM sp. z.o.o. Łęczna / Region Centralno-Wschodni	Inwestycja zrealizowana
		Miasto Lublin, ZZO w Lubartowie / Region Centralny	Inwestycja zrealizowana
		ZPOK Srebrzyszcze / Region Chełm	Inwestycja zrealizowana
		ZZO Kraśnik, ZZO w Bełżycach / Region Południowo-Zachodni	Inwestycja zrealizowana ZZO Kraśnik – kolejne etapy realizacji inwestycji zostały zaplanowane w WPGO 2022.
		PGK sp. z.o.o. w Biłgoraju / Region Południowy	Inwestycja zrealizowana – kolejne etapy realizacji inwestycji zostały zaplanowane w WPGO 2022.
		Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego / Region Północno - Zachodni	Inwestycja zrealizowana – kolejne etapy realizacji inwestycji zostały zaplanowane w WPGO 2022.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
		ZUK Puławy / Region Puławy	Inwestycja zrealizowana
		PGK sp. z o.o. Zamość / Region Zamość	Inwestycja zrealizowana

Zadania inwestycyjne umieszczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 (nieujęte w PZPWL 2015) obejmują:

- **Inwestycje zrealizowane w zakresie budowy i rozbudowy składowisk odpadów:**
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju, ZZO w Korczowie/ Region Południowy.
- **Inwestycje zrealizowane w zakresie budowy / rozbudowy instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:**
 - Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o./ ZZO dla Regionu Biała Podlaska/ Region Biała Podlaska,
 - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o. Wincentów/ Region Centralno-Wschodni,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o./ Region Centralno-Wschodni,
 - KOM-EKO S.A. Lublin/ ZZO KOM-EKO S.A. Lublin/ Region Centralno-Zachodni,
 - Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Kraśnik/ Region Centralno-Zachodni,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o./ Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Chełm, Srebrzyszcze/ Region Chełm,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Biłgoraj/ZZO w Korczowie/ Region Południowy,
 - Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego Sp. z o.o./ Region Północno-Zachodni,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. w Zamościu/ Region Zamość,
 - Miasto Lublin/Rokitno, gm. Lubartów/ RZZO w Dębowcu, Skierbieszów/ Region Centralno–Zachodni.
- **Inwestycje zrealizowane w zakresie budowy / rozbudowy innych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (składowisk odpadów innych niż niebezpieczne):**
 - MIR-EKO Sp. z o.o./ Łasków/ Region Południowy,
 - Miasto Łuków/ Region Północno-Zachodni.
- **Inwestycje niezrealizowane w zakresie budowy / rozbudowy innych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (składowisk odpadów innych niż niebezpieczne):**
 - Miasto Lublin/ Rokitno/ Region Centralno-Zachodni,
 - ZZO w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego/ Region Północno-Zachodni.

Z zakresu inwestycji w gospodarce odpadami niebezpiecznymi nie udało się zrealizować kluczowej dla województwa instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dokument, który zostanie przyjęty do końca 2022 r. wskaże nowe potrzeby inwestycyjne w zakresie niezbędnej infrastruktury do gospodarowania odpadami na terenie województwa lubelskiego z uwzględnieniem okresu ich realizacji w latach 2023-2028.

2.5. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Zadania inwestycyjne umieszczone w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły (*... – przedsięwzięcia uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego)

Tab. 19. Budowa zbiorników retencyjnych

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
68.	Budowa zbiornika małej retencji Brodzica w Hrubieszowie (lista 2, poz. 95)	Gmina Miejska Hrubieszów / Hrubieszów	Inwestycja zaniechana Aktualnie, na zlecenie RZGW w Lublinie wykonywana jest koncepcja programowo - przestrzenna dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika wodnego na rzece Huczwa w m. Hrubieszów, woj. Lubelskie” ujętego w Programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW WP ³ bez określonego dla wykonania rzeczowego źródła finansowania.

³ PGW WP - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie funkcjonuje od 1 stycznia 2018 r. i jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Struktura organizacyjna PGW WP obejmuje: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie,

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
69.	Budowa zbiornika retencyjnego z jazem Wolica w miejscowości Topola (lista 2, poz. 94)	Gmina Izbica / Izbica	Inwestycja odroczone (2024-2026) Realizacja inwestycji pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika retencyjnego z jazem Wolica w miejscowości Topola”.
70.	Budowa zbiornika retencyjnego Witowice - Chrzążów (lista 2, poz. 168)	Gmina Końskowola /Końskowola	Inwestycja odroczone (2021-2027) Inwestycja wpisana na Zintegrowaną Listę Przedsięwzięć do Strategii Rozwoju WL do 2030 roku. Inwestycja gminna – nie przewidziana do realizacji przez PGW WP.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
71.	Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz (lista 2, poz. 166)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łopiennik Górny, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Trawniki	<p>Inwestycja odroczone (2021-2027)</p> <p>Inwestycja wpisana na Zintegrowaną Listę Przedsięwzięć do Strategii Rozwoju WL do 2030 r.</p> <p>W roku 2021 RZGW w Lublinie odebrał koncepcję programowo – przestrzenną na zadanie pn. „Budowa zbiornika Oleśniki, z wyborem wariantu jako zbiornik dwukomorowy o pow. 1257 ha i poj. 25,7 mln m³”.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w PPI⁴ bez zapewnionego źródła finansowania.</p>
72.	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Biała Podlaska (lista 2, poz. 96)	Gmina Miejska Biała Podlaska /m. Biała Podlaska	Inwestycja niezrealizowana
73.	Budowa zbiornika małej retencji w Kaleniu (lista 2, poz. 25)	Gmina Markuszów / Markuszów	Inwestycja zrealizowana
74.	Budowa zbiornika wodnego Szczecin (lista 2, poz. 161)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie	<p>Inwestycja zaniechana</p> <p>Inwestycja nie została ujęta w PPI.</p>

⁴ PPI - Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
75.	Budowa zbiornika małej retencji wodnej Poczekajka (lista 2, poz. 92)	Gmina Rejowiec Fabryczny / Rejowiec Fabryczny (gm. wiejska)	Inwestycja zaniechana Inwestycja nie została ujęta w PPI.
76.	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Brody Małe (lista 2, poz. 165)	Urząd Miasta Szczepieszyń / Szczepieszyń	Inwestycja zaniechana Inwestycja nie została ujęta w PPI.
77.	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kobyłany (lista 2, poz. 97)	Gmina Terespol / Terespol	Inwestycja zrealizowana.
78.	Budowa zbiornika wodnego Piaski (lista 2, poz. 167)	Gmina Piaski / Trawniki, Piaski (obszar wiejski)	Inwestycja odroczone Inwestycja zgłoszona do PPSS 2021 ⁵ , lista C. Inwestycja gminna – nie przewidziana do realizacji przez PGW WP.
79.	Budowa zbiornika wodnego Wąwolnica (lista 2, poz. 188)	Gmina Wąwolnica / Wąwolnica	Inwestycja odroczone (2021–2027) Inwestycja wpisana na Zintegrowaną Listę Przedsięwzięć do Strategii Rozwoju WL do 2030 roku. Inwestycja gminna – nie przewidziana do realizacji przez PGW WP.

⁵ PPSS 2021 - Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
80.	Budowa zbiornika wodnego Wola Żółkiewska na rzece Żółkiewka w km 24+880 (lista 2, poz. 93)	Gmina Żółkiewka / Żółkiewka	Inwestycja odroczone Inwestycja gminna – nie przewidziana do realizacji przez PGW WP.
81.	Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Jacynka w miejscowości Jacnia (lista 2, poz. 10)	Gmina Adamów / Adamów (pow. zamojski)	Inwestycja zrealizowana
82.	Budowa zbiornika małej retencji „Czajki” w gminie Kraśniczyn (lista 2, poz. 11)	Gmina Kraśniczyn / Kraśniczyn	Inwestycja zrealizowana
83.	Odbudowa jazu Sielczyk na rzece Krzna w km 36+350 w m. Biała Podlaska (lista 2, poz. 21)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Biała Podlaska (gmina miejska)	Inwestycja zrealizowana

Tab. 20. Rozbudowa / modernizacja zbiorników retencyjnych

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
84.	Odbudowa i uszczelnienie grobli i czaszy zbiornika Żelizna (lista 1, poz. 619)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Drelów, Komarówka Podlaska	Inwestycja odroczone Zbiornik ujęty w Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW WP pn. Odbudowa i uszczelnienie grobli i czaszy zbiornika Żelizna (...).

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
85.	Odbudowa zbiornika Zaborek i Kozioł wraz z obiektami towarzyszącymi (lista 1, poz. 712)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Janów Podlaski	Inwestycja odroczone W ramach inwestycji planowane jest wykonanie w br. dokumentacji projektowej dla zadania pn. Ubezpieczenie zapory czołowej zbiornika Zaborek, gm. Janów Podlaski - zadanie planowane do ujęcia w aktualizacji PPI w 2022 r.
86.	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz-Krzna, ob. 3 - grobla zbiornika Dratów w km 2+137 -3+340, gm. Łęczna, pow. łęczyński (lista 1, poz. 441)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łęczna	Inwestycja odroczone Zbiornik ujęty w PPI.
87.	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz-Krzna, ob. 1 - grobla zbiornika Dratów wzdłuż Kanału Wieprz-Krzna w km 38+260 - 39+946 (kilometr 3+340 - 5+026 grobli zbiornika), gm. Łęczna, pow. łęczyński (lista 1, poz. 439)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łęczna	Inwestycja zrealizowana
88.	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz-Krzna, ob. 2 - grobla zbiornika Dratów w km 0+000- 2+137, gm. Łęczna, pow. łęczyński (lista 1, poz.440)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łęczna	Inwestycja odroczone Zbiornik ujęty w PPI.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
89.	Odbudowa zbiornika Krzcień wraz z budowlami (lista 1, poz. 730)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Ludwin	Inwestycja odroczone Zadanie planowane do zgłoszenia do aktualizacji PPI w roku 2022.
90.	Odbudowa zbiornika Mytycze wraz z budowlami (lista 1, poz. 729)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Ostrów Lub. (obszar wiejski)	Inwestycja odroczone Zadanie planowane do zgłoszenia do aktualizacji PPI w roku 2022.
91.	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 1 przebudowa grobli i budowli zbiornika w km 0+000 - 2+080, gm. Podedwórze (lista 1, poz. 612)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Podedwórze	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
92.	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 3 odmulenie czaszy zbiornika na pow. 100 ha, gm. Podedwórze (lista 1, poz. 614)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Podedwórze	Inwestycja odroczone Inwestycja planowana data realizacji 2022-2027 (PPSS): Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty – II etap – przebudowa grobli w km 0 + 000–2 + 080 i 5 + 270–8 + 040 i czaszy zbiornika, ob. 3 odmulenie czaszy zbiornika na pow. 385 ha, gm. Podedwórze. Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
93.	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 2 przebudowa grobli i budowli zbiornika w km 5+270 - 8+040, gm. Podedwórze (lista 1, poz. 613)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Podedwórze, Wyrki	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
94.	Modernizacja (przebudowa) grobli i budowli zbiornika Mosty gm. Podedwórze, pow. Parczew, woj. lubelskie (lista 1, poz. 234)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Podedwórze	Inwestycja zrealizowana
95.	Odbudowa i uszczelnienie grobli i czaszy zbiornika Opole (lista 1, poz. 618)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Podedwórze, Jabłoń, Wisznice	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania. W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa w ramach zadania pn. Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole (...).
96.	Odbudowa zbiornika Wytyczno wraz z budowlami (lista 1, poz. 731)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Urszulin	Inwestycja odroczone Zadanie planowane do zgłoszenia do aktualizacji PPI w roku 2022.
97.	Odbudowa zbiornika Zahajki wraz z budowlami (lista 1, poz. 728)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Wyrki	Inwestycja odroczone Zadanie planowane do zgłoszenia do aktualizacji PPI w roku 2022.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
98.	Przebudowa zbiornika retencyjnego Gorzków (lista 1, poz. 713)	Gmina Gorzków / Gorzków	Inwestycja zrealizowana
99.	Odbudowa zbiornika wodnego Leliszki na rzece Sołokija (lista 1, poz. 714)	Gmina Tomaszów Lubelski / Jarczów	Inwestycja w realizacji W br. planowane rozpoczęcie realizacji zadania ze środków utrzymaniowych w zakresie odmulenia zbiornika.
100.	Zbiornik wodny „Zemborzyce” w Lublinie. Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego w zakresie budowli zapory czołowej z jazem (lista 1, poz.438)	Gmina Lublin/ m. Lublin	Inwestycja odroczone Planowana do realizacji w latach 2022-2026 (PPSS) pn. Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie - Obiekt I „Przebudowa zapory czołowej na długości 573 m wraz z jazem w km 32+900 rzeki Bystrzycy oraz budowa spustu dennego i przepławki dla ryb”. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w PPI bez określonego dla wykonania zakresu rzeczowego źródła finansowania.

Tab. 21. Odbudowa i modernizacja systemów melioracyjnych

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
101.	* Odbudowa i rewitalizacja systemu wodnego Kanału Wieprz - Krzna - etap I, element 1 w km 11+000 - 40+570 - Zad. I „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 11+000 - 40+570 Część III w km 30+530 - 40+570” (lista 1, poz. 725)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Ludwin, Puchaczów	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
102.	* Odbudowa i rewitalizacja systemu wodnego Kanału Wieprz - Krzna - etap I, element 2 w km 40+570 - 71+000 - Zad. II „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 40+570 - 71+000 Część I w km 40+570 - 49+730” (lista 1, poz. 594)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Ludwin, Uścimów	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
103.	Melioracje użytków rolnych „Szaniawy” gm. Trzebieszów pow. Łukowski - Etap I melioracje użytków rolnych na pow. 500 ha (lista 1, poz. 620)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łuków (gm. wiejska), Trzebieszów, Kąkolewnica Wschodnia	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
104.	Halasy - melioracje użytków rolnych (lista 1, poz. 621)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Międzyrzec Podlaski (gm. wiejska)	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
105.	* Odbudowa i rewitalizacja systemu wodnego Kanału Wieprz - Krzna - etap I, element 1 w km 11+000 - 40+570 - Zad. I „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 11+000 - 40+570 Część II w km 21+150 - 30+530” (lista 1, poz. 724)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Milejów, Puchaczów	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
106.	Melioracje użytków rolnych „Nielisz” (lista 1, poz. 735)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Nielisz	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
107.	* Odbudowa i rewitalizacja systemu wodnego Kanału Wieprz - Krzna - etap I, element 2 w km 40+570 - 71+000 - Zad. II „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 40+570 - 71+000 Część III w km 59+570 - 71+000” (lista 1, poz. 727)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Sosnowica	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
108.	Kujawy - Jarczówek melioracje użytków rolnych, ob. 1a, 2 i 3 na pow. 243 ha, gm. Stanin, pow. Łuków (lista 1, poz. 912)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stanin	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
109.	Kujawy - Jarczówek melioracje użytków rolnych, gm. Stanin, pow. Łuków, obiekt 1 (lista 1, poz. 233)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stanin	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
110.	Melioracje użytków rolnych „Sułów” (lista 1, poz. 733)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Sułów, Szczepieszyn (miasto)	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
111.	* Odbudowa i rewitalizacja systemu wodnego Kanału Wieprz - Krzna - etap I, element 1 w km 11+000 - 40+570 - Zad. I „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 11+000 - 40+570 Część I w km 11+000 - 21+150” (lista 1, poz. 617)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Trawniki, Siedliszcze, Milejów	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
112.	Melioracje użytków rolnych „Trzeszczany” (lista 1, poz. 734)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Trzeszczany	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
113.	* Odbudowa i rewitalizacja systemu wodnego Kanału Wieprz - Krzna - etap I, element 2 w km 40+570 - 71+000 - Zad. II „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 40+570 - 71+000 Część II w km 49+730 - 59+710” (lista 1, poz. 726)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Uścimów, Sosnowica	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
114.	Odbudowa i rewitalizacja systemu wodnego Kanału Wieprz - Krzna - etap II, element 1 w km 71+000 - 139+890 - Zad. III „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 71+000 - 139+890” (lista 2, poz. 99)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Ludwin, Uścimów, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podl., Drelów, Międzyrzec Podl. (gm. wiejska), Międzyrzec Podl. (gm. miej.)	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.

Tab. 22. Budowa / rozbudowa wałów przeciwpowodziowych

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
115.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180 gm. Annapol, pow. Kraśnik, ob. 1 w km 0+000-1+975 (lista 1, poz. 581)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annapol	Inwestycja zrealizowana
116.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180 gm. Annapol, pow. Kraśnik, ob. 2 w km 1+975-3+608 (lista 1, poz. 582)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annapol	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
117.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180 gm. Annapol, pow. Kraśnik, ob. 3 w km 3+608-5+005 (lista 1, poz. 583)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annapol	Inwestycja zrealizowana
118.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180 gm. Annapol, pow. Kraśnik, ob. 4 w km 5+005-8+180 (lista 1, poz. 584)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annapol	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
119.	Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km 0+000-4+100 wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, gm. Dęblin i Stężyca, obiekt 5 - rozbudowa wału wiślanego w km od 0+110 do km 0+240 wraz z mobilnym systemem zabezpieczenia budynków MDK w Dęblinie (lista 1, poz. 425)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Dęblin	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
120.	Rozbudowa wału wstecznego rzeki Wieprz w km 0+000 - 4+027 (od mostu drogowego nad rzeką Wieprz do m. Masów), tj. na dł. 4,027 wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego „miejskiego” rzeki Wisły w km 0+000 - 0+795 (od mostu drogowego nad rzeką Wieprz do mostu kolejowego w m. Dęblin), tj. na dł. 0,795 km w dolinie Stężyckiej. (lista 1, poz. 616)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Dęblin	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania. Aktualnie w trakcie opracowania koncepcja wraz z dokumentacją projektową dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego m. Dęblin.
121.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000 – 4+300 i wału wstecznego rzeki Wyżnicy w km 0+000 – 2+370 w dolinie Józefowskiej, gm. Józefów, pow. Opole Lubelskie (lista 1, poz. 585)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Józefów	Inwestycja w realizacji Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania. Aktualnie złożony został wniosek do RDOŚ w Lublinie o wyrażenie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
122.	Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w m. Kazimierz Dolny (hektometr wału p.pow. w km 4+025 w Kazimierzu Dolnym a hektometrem wału w dolinie Puławsko - Parchacko - Bochoćnickiej w km 0+000 w Bochoćnicy) wraz z mobilnym zabezpieczeniem na cieku Grodarz w km 0+000 - 0+220 i budową kładki na rzece Bystrej (lista 1, poz. 615)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Kazimierz Dolny (miasto), Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	Inwestycja w realizacji Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania. Ze względu na odmowę wydania decyzji środowiskowej dla tego zadania zostało ono podzielone na dwa zadania: - obiekt 1 – budowa wału przeciwpowodziowego na długości 1,062 km z przystosowaniem korony wału dla celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi. - obiekt 2 – podwyższenie murów przeciwpowodziowych (mobilne zabezpieczenie) cieku Grodarz.
123.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko - Parchacko - Bochoćnickiej w km 0+000 - 4+580 oraz wału cofkowego rzeki Bystrej - ob. 3 wraz z kształtowaniem jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego, ob. 4 - rozbudowa wału ob. 3 w km 0+000 - 1+558, - wał cofkowy ob. 3 w km 0+000 - 0+068 - koryto rzeki Bystrej ob. 4 w km 0+000 - 0+455 (lista 1, poz. 929)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
124.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko - Parchacko - Bochatnickiej w km 0+000 - 4+580 ob. 1 w km 3+203 - 4+580, gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj. lubelskie (lista 1, poz. 237)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana
125.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko - Parchacko - Bochatnickiej w km 0+000 - 4+580 ob. 2 w km 1+558 - 3+203, gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj. lubelskie (lista 1, poz. 240)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana
126.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680-11+403 (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 4 w km 9+480- 11+024 na dł. 1,544 km (lista 1, poz. 424)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łaziska	Inwestycja zrealizowana
127.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680-11+403 (11+024) gm. Łaziska pow. Opole Lubelskie - obiekt 3 w km 5+830- 9+480 na długości 3,650 km (lista 1, poz. 127)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łaziska	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
128.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680-11+403 (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 1 w km 2+680- 4+420 na dług. 1,740 km (lista 1, poz. 575)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łaziska	Inwestycja zrealizowana
129.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680-11+403 (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 2 w km 4+420- 5+830 na dł. 1,410 km (lista 1, poz. 576)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łaziska	Inwestycja zrealizowana
130.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, obiekt 1 w km 4+100-5+292 na długości 1,192 km, gm. Stężyca (lista 1, poz. 577)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stężyca	Inwestycja zrealizowana
131.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, obiekt 2 w km 5+292-8+262 na długości 2,970 km, gm. Stężyca (lista 1, poz. 578)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stężyca	Inwestycja zrealizowana
132.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, obiekt 3 w km 8+262-9+600 na długości 1,338 km, gm. Stężyca (lista 1, poz. 579)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stężyca	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
133.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, obiekt 4 budowa pompowni w km 9+560 wraz z odbudową przepustu wałowego w km 9+533 w m. Prażmów (lista 1, poz. 580)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stężyca	Inwestycja zrealizowana
134.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 9+600 - 14+200, tj. na długości 4,600 km, wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) w km 0+000 – 0+516, tj. na długości 0,516 km w m. Piotrowice (lista 1, poz. 732)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stężyca	Inwestycja w realizacji Zadanie: - ujęte w PPI pod numerem ID PPI 273, bez zapewnionego źródła finansowania, - zgłoszone do aPZRP ⁶ .
135.	Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km 0+000-4+100 wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, obiekt 1, 2, 3, 4 gm. Dęblin i Stężyca (lista 1, poz. 426)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stężyca, Dęblin	Inwestycja zrealizowana
136.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa) (lista 2, poz. 87)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Stężyca	Inwestycja w trakcie realizacji - planowane ukończenie inwestycji w 2022 r. Aktualnie opracowana została dokumentacja wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi.

⁶ aPZRP - aktualizacja Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
137.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w m. Gołąb w km 2+500 – 8+700, obiekt 2 w km 5+620 – 8+700 na dł. 3,080 km, gm. Puławy (lista 1, poz. 128)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Puławy (gmina wiejska)	Inwestycja zrealizowana
138.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w m. Gołąb w km 2+500 – 8+700, obiekt 1 w km 2+500 – 5+620 na dł. 3,120 km, gm. Puławy (lista 1, poz. 232)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Puławy (gmina wiejska)	Inwestycja zrealizowana
139.	Modernizacja obwałowania wstecznego rzeki Sanny w Dolinie Janiszowskiej w km 0+000 - 8+835, obiekt 4 odbudowa (modernizacja) wału w km 4+550 - 6+220 na dł. 1,670 km (lista 1, poz. 289)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annopol	Inwestycja zrealizowana
140.	Modernizacja obwałowania wstecznego rzeki Sanny w Dolinie Janiszowskiej w km 0+000 – 8+835, obiekt 5 odbudowa (modernizacja) wału w km 6+220 – 8+835 na dług. 2,615 km (lista 1, poz. 290)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annopol	Inwestycja zrealizowana
141.	Modernizacja (rozbudowa) obwałowania rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km 20+310 – 23+360, ob. 1 w km 20+310 – 21+678 (lista 1, poz. 235)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Wilków	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
142.	Modernizacja (rozbudowa) obwałowania rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km 20+310 – 23+360, ob. 2 i 3 w km 21+678 – 23+360 (lista 1, poz. 239)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Wilków	Inwestycja zrealizowana
143.	Rozbudowa wału wstecznego prawego rzeki Chodelki w km 0+000 – 3+325, obiekt 4 w km 0+000 – 1+700 (lista 1, poz. 236)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Wilków	Inwestycja zrealizowana
144.	Rozbudowa wału wstecznego prawego rzeki Chodelki w km 0+000 – 3+325, obiekt 5 w km 1+700 – 3+325 (lista 1, poz. 238)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Wilków	Inwestycja zrealizowana
145.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Janiszowskiej zad. I Janiszów – Zabełcze w km 0+000 – (8+080) – 3+820 (11+900) m. i gm. Annopol, obiekt 2 w km 1+710 – 3+820 (lista 1, poz. 285)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annopol (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana
146.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Janiszowskiej zad. I Janiszów – Zabełcze w km 0+000 – (8+080) – 3+820 (11+900) m. i gm. Annopol, obiekt 1 w km 0+000 – 1+710 (lista 1, poz. 286)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annopol (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
147.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Janiszowskiej zad. II Zabelcze – Opoka w km 3+820 – (11+900) – 7+080 (15+160) m. i gm. Annopol, obiekt 1 w km 11+900 – 13+300 (lista 1, poz. 287)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annopol (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana
148.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Janiszowskiej zad. II Zabelcze – Opoka w km 3+820 – (11+900) – 7+080 (15+160) m. i gm. Annopol, obiekt 2 w km 13+300 – 15+160 (lista 1, poz. 288)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Annopol (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana

Tab. 23. Odbudowa koryt i zabezpieczenie brzegów rzek

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
149.	Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz w km 37 w m. Sobieszyn, gm. Ułęż, pow. Ryki, woj. lubelskie (lista 1, poz. 1130)	RZGW w Warszawie / Baranów, Ułęż	Inwestycja zrealizowana
150.	Wykonanie opaski brzegowej w km 460-461 w m. Dorohusk, (lista 1, poz. 431)	RZGW w Warszawie / Dorohusk	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
151.	Budowa opaski brzegowej w km 475-476 w m. Kolemczyce (lista 1, poz. 600)	RZGW w Warszawie / Dorohusk	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
152.	Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Bug w km 496-497 w m. Skryhiczyn (lista 1, poz. 1128)	RZGW w Warszawie / Dubienka	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
153.	Budowa opaski brzegowej w km 338-339 w m. Mościce (lista 1, poz. 1109)	RZGW w Warszawie / Sławatycze	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
154.	Budowa ostróg na prawym brzegu rz. Wisły w km 396-397 w m. Stężyca (lista 1, poz. 555)	RZGW w Warszawie / Stężyca	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
155.	Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Bug graniczny w km 268-269 w m. Krzyczew (lista 1, poz. 632)	RZGW w Warszawie / Terespol (gm. wiejska)	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
156.	Odbudowa opaski brzegowej na rzece Wieprz w km 164,0 w m. Pełczyn, gm. Trawniki, pow. Świdnik, woj. lubelskie (lista 1, poz.394)	RZGW w Warszawie / Trawniki	Inwestycja zrealizowana
157.	Odbudowa opaski brzegowej w km 364-365 rzeki Bug w m. Stawki (lista 1, poz. 599)	RZGW w Warszawie / Włodawa (gm. wiejska)	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
158.	Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Bug w km 381-382 w m. Orchówek (lista 1, poz. 1126)	RZGW w Warszawie / Włodawa (gm. wiejska)	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
159.	Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Wieprz w km 14, w m. Sędowice, gm. Ryki, pow. Ryki, woj. lubelskie (lista 1, poz. 145)	RZGW w Warszawie / Ryki (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana
160.	Odbudowa koryta rzeki Wieprz w km 295+000 - 303+200 – gm. Tarnawatka, woj. lubelskie (lista 1, poz. 392)	RZGW w Warszawie / Tarnawatka, Tomaszów Lubelski (gm. wiejska)	Inwestycja zrealizowana
161.	Odbudowa budowli regulacyjnych na prawym brzegu rz. Wisły w m. Kępa Chotecka, gm. Wilków, pow. Opole Lubelskie (lista 1, poz. 110)	RZGW w Warszawie / Wilków	Inwestycja zrealizowana
162.	Odbudowa i wykonanie nowych budowli regulacyjnych na lewym brzegu rz. Wisły w rejonie ujścia rz. Plewki (lista 1, poz. 388)	RZGW w Warszawie / Janowiec	Inwestycja zrealizowana
163.	Odbudowa budowli regulacyjnych na prawym brzegu rz. Wisły w m. Wólka Gołębska (lista 1, poz. 387)	RZGW w Warszawie / Puławy (gm. wiejska)	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
164.	Odbudowa opaski brzegowej w km 275-276 w m. Kuzawka (lista 1, poz. 113)	RZGW w Warszawie / Hanna	Inwestycja zrealizowana
165.	Przebudowa progu korekcyjnego rzeki Bystrzycy w km 24+720 w m. Lublin (lista 1, poz. 176)	RZGW w Warszawie / M. Lublin	Inwestycja zrealizowana
166.	Przebudowa 5 ostróg regulacyjnych na lewym brzegu rz. Wisły w km 307+900 - 308+800 w m. Wesołówka (lista 1, poz. 403)	RZGW w Warszawie / Annopol (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana
167.	Przywrócenie parametrów eksploatacyjnych Drogi Wodnej Górnej Wisły na odcinku od Krakowa do Sandomierza i do ujścia Sanny (km 92+600 do 295+200) (lista 2, poz. 196)	RZGW w Krakowie / Annopol (obszar wiejski)	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
168.	Odbudowa koryta Kanału Podlipie w km 0+000 - 2+200 tj. 2,200 km w m. Moniaki, gm. Urzędów, pow. kraśnicki (lista 1, poz. 242)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Urzędów	Inwestycja zrealizowana
169.	Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki Bukowa w km 41+500 - 55+490 na długości 13,990 km (lista 2, poz. 175)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Biłgoraj (gm. wiejska), Frampol (obszar wiejski), Janów Lub. (obszar wiejski)	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
170.	Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprz. oraz układu poziomego) koryta rzeki Złota Korców (Złota Nitka) w km 0+000 - 16+300 na dł. 16,300 km (lista 2, poz. 174)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Księżpol	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
171.	Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000 - 5+750, zadanie II w km 2+250 - 5+750, obiekt 1 i 2 na dł. 3,250 km (zrealizowane), gm. Łukowa, pow. Biłgoraj (lista 2, poz. 38)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łukowa	Inwestycja zrealizowana
172.	Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000 - 5+750, zadanie I w km 0+000 - 2+250, tj. na dł. 2,250 km (zrealizowane), gm. Łukowa, pow. Biłgoraj (lista 2, poz. 39)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Łukowa	Inwestycja zrealizowana
173.	Udrożnienie (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) rzeki Stanianka w km 0+000 - 7+700, tj. 7,7 km wraz z zagospodarowaniem źródeł, gm. Potok Wielki, pow. Janów Lubelski (lista 2, poz. 79)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Potok Wielki, Zaklików	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
174.	Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km 0+000 - 2+120 w m. Hrubieszów (lista 1, poz. 109)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / m. Hrubieszów	Inwestycja zrealizowana
175.	Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki Wełnianki w km 21+732 - 23+668 (lista 1, poz. 241)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Białopole	Inwestycja zrealizowana
176.	Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki Pasternik w km 2+000 - 4+077 (lista 1, poz. 291)	Wojewódzki ZMiUW w Lublinie / Tarnogród (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana
177.	Zagospodarowanie terenu portu i terenu pobraża rzeki Wisły – cz. II w Puławach, realizowanego w ramach Projektu p.n. „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” (lista 1, poz. 173)	Miasto Puławy / Puławy (gm. miejska), Janowiec, Kazimierz Dolny (miasto)	Inwestycja zrealizowana
178.	Budowa MEW przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Wieprz w miejscowości Turzyniec (lista 1, poz. 591)	Instytut OZE Sp. Z o.o. / Zwierzyniec (obszar wiejski)	Inwestycja odroczone Inwestycja planowana do realizacji przez osobę prywatną.

Inne zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej

Tab. 24. Zadania inwestycyjne umieszczone w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
179.	Odbudowa zbiornika wodnego w Bochothnicy	WZMiUW w Lublinie / Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
180.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 19+840 - 23+360 i obwałowania wstecznego prawego rzeki Chodelki	WZMiUW w Lublinie / Wilków	Inwestycja zrealizowana
181.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego odcinek Wisły w dolinie Puławsko - Parchacko - Bochothnickiej w km 0+000 - 4+580	WZMiUW w Lublinie / Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	Inwestycja zrealizowana
182.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego Dęblin - Stężycza Piotrowice w km 0+000-14+312	WZMiUW w Lublinie / Stężycza	Inwestycja w realizacji Zadanie etapowane: - modernizacja wałów w km 0+000 - 4+100 - zadanie zrealizowane, - modernizacja wałów w km 4+100 - 9+600 - zadanie zrealizowane, - pozostała część została ujęta w aPZRP.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
183.	Odbudowa koryta rzeki Por i regulacja stosunków wodnych w jej dolinie. Odbudowa i modernizacja koryta rzeki Por dla uregulowania gospodarki wodnej na użytkach rolnych oraz odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego i układu poziomego koryta rzeki na odcinku 4+150 - 15+050 na dł. 10,90km)	WZMiUW w Lublinie / Sułów, Radezczyca	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
184.	Budowa wału wiślanego w Piotrowicach w km 14+312 - 16+312 na dł. 2,00 km oraz pompownia w miejscowości Piotrowice - Maciejowice	WZMiUW w Lublinie / Stężyca	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
185.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Janiszowskiej	WZMiUW w Lublinie / Annopol	Inwestycja zrealizowana
186.	Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Bug w miejscowości Dorohusk	RZGW w Warszawie / Dorohusk	Inwestycja zrealizowana
187.	Zabezpieczenie erodowanego brzegu Wisły w km 406 w miejscowości Drachalica	RZGW w Warszawie / Stężyca	Inwestycja zrealizowana
188.	Zabezpieczenie erodowanego prawego brzegu Wieprza w km 43 w miejscowości Blizocin	RZGW w Warszawie / Kock	Inwestycja zrealizowana
189.	Polder Stężycko – Maciejowicki z budowlami odwadniającymi i użytkowymi z pompownią w Prażmowie i służą w Młynkach	WZMiUW w Lublinie / Stężyca	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
190.	Odbudowa (kształtowanie) przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Kosarzewka w km 0+000 - 24+000	WZMiUW w Lublinie / Strzyżewice, Jabłonna, Bychawa	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.

Tab. 25. Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
191.	Rewitalizacja Doliny Krzyny na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Biała Podlaska	WZMiUW w Lublinie / m. Biała Podlaska	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.

Tab. 26. Zadania inwestycyjne umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
192.	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz- Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczyński, obiekt 3 - grobla zbiornika Dratów km 2+137 - 3+340	WZMiUW w Lublinie / Ludwin	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
193.	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz- Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczyński, obiekt 1 - grobla zbiornika Dratów wzdłuż Kanału Wieprz - Krzna w km 38+260 - 39+946 (kilometr 3+340 - 5+026 grobli zbiornika)	WZMiUW w Lublinie / Ludwin	Inwestycja zrealizowana
194.	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz - Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczyński, obiekt 2 - grobla zbiornika Dratów w km 0+000 - 2+137	WZMiUW w Lublinie / Ludwin	Inwestycja odroczone Zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.
195.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 - 8+180 (8+184), obiekt 1 w km 0+000 - 1+975 na długości 1,975 km, gm. Annopol, pow. Kraśnik	WZMiUW w Lublinie / Annopol	Inwestycja zrealizowana
196.	Kujawy-Jarczówek - melioracje użytków rolnych, ob. 1a, 2, gm. Stanin, pow. Łuków, woj. lubelskie	WZMiUW w Lublinie / Stanin	Inwestycja zaniechana Zadanie nieujęte w PPI.
197.	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 - 11+403 (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 4 w km 9+480 - 11+024 na dł. 1,544 km	WZMiUW w Lublinie / Łaziska	Inwestycja zrealizowana

Nowe zadania inwestycyjne umieszczone w Programie przeciwdziałania skutkom suszy przyjętym w drodze Rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury w dnia 15 lipca 2021 r.:

- odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 11 + 000 - 76 + 000, 76 + 000 - 139 + 890 (RZGW Lublin) – zadanie w trakcie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych / przewidziane do realizacji w latach 2022-2027 / ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania,
- zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina przez odbudowę budowli piętrzących (RZGW Rzeszów) – inwestycja w realizacji (2021-2022),
- zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica przez odbudowę budowli piętrzących w km: 1 + 890, 5 + 640, 6 + 510, 7 + 620, 23 + 096, 23 + 556, 23 + 729, 24 + 107, 29 + 150, 29 + 240 (RZGW Lublin) – zadanie w trakcie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych / przewidziane do realizacji w latach 2022-2027 / ujęte w PPI,
- budowa zbiornika retencyjnego Brodziaki na rzece Czarnej Ładzie w gminie Biłgoraj – lista C (Wójt Gminy Biłgoraj / gm. Biłgoraj) - nie przewiduje się realizacji inwestycji w ramach perspektywy na lata 2022-2027,
- budowa zbiornika retencyjnego Kosin – lista C (Wojewoda Lubelski/ gm. Annopol) – nie przewiduje się realizacji inwestycji w ramach perspektywy na lata 2022-2027,
- zwiększenie retencji wód opadowych na działce nr 3171 przy ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie – lista C (Burmistrz Miasta Hrubieszów / m. Hrubieszów) – zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania,
- budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w delcie rzeki Krzyny i Klukówki – lista C (Wójt Gminy w Białej Podlaskiej / gm. Biała Podlaska) – zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania,
- budowa zastawki na rzece Muława – lista C (Wójt Gminy Rossosz / gm. Rossosz) – zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania.

Nowe zadania inwestycyjne planowane w projekcie aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły:

- rozbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000 - 6+990 w m. Janowiec, gm. Puławy (PGW WP / ZZ w Radomiu) – zadanie znajduje się na wstępnej liście FEnIKS 2021-2027, która będzie podlegać dalszej aktualizacji i analizie przez PGW WP,
- odbudowa i modernizacja lewej grobli w km 6+100 - 9+480, gm. Wilków (zastępuje działanie: Rozbudowa wału lewego rzeki Chodelki w km 6+100 - 9+480, gm. Wilków) (PGW WP / ZZ w Radomiu) – umieszczone w aPZRP pn. „Rozbudowa wału lewego rzeki Chodelki w km 6+100-9+480, gm. Wilków”,
- odbudowa i modernizacja prawej grobli w km 3+325 - 6+705, gm. Wilków (zastępuje działanie: Rozbudowa wału prawego rzeki Chodelki w km 3+325 - 6+705, gm. Wilków) (PGW WP/ZZ w Radomiu) - w aPZRP zadanie pn. „Rozbudowa wału prawego rzeki Chodelki w km 3+325 - 6+705, gm. Wilków”.
- budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w m. Kazimierz Dolny (hektometr wału p.pow. w km wału 4+025 w Kazimierzu Dolnym a hektometrem wału w dolinie Puławsko – Parchacko – Bochotnickiej w km 0+000 w Bochotnicy) m. Kazimierz Dolny,
pow. Puławy - obiekt 1 - budowa wału przeciwpowodziowego na długości 1,062 km z przystosowaniem korony wału dla celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi (PGW WP/ZZ w Radomiu) – zadanie ujęte w PPI bez zapewnionego źródła finansowania. Ze względu na odmowę wydania decyzji środowiskowej dla tego zadania zostało ono podzielona na dwa zadania:

- obiekt 1 – budowa wału przeciwpowodziowego na długości 1,062 km z przystosowaniem korony wału dla celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi,
- obiekt 2 – podwyższenie murów przeciwpowodziowych (mobilne zabezpieczenie) cieku Grodarz.
- przebudowa przepompowni w miejscowości Janiszów, gm. Annopol, pow. Kraśnicki (PGW WP RZGW w Krakowie/ Zarząd Zlewni w Sandomierz/ gm. Annopol, pow. Kraśnicki - obszar wiejski) - zadanie ujęte w PPI oraz aPZRP.

2.6. Ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego

Tab. 27. Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
198.	Muzeum – Miejsce Pamięci Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Włodawa	Inwestycja w realizacji Zadanie ma charakter wieloletni.

2.7. Budowa, rozbudowa i modernizacja budynków dla urzędów organów władzy, administracji, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia

Tab. 28. Zadania inwestycyjne umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
199.	Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL / Lublin	Inwestycja zrealizowana
200.	Modernizacja Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie / Lublin	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
201.	Przebudowa budynku przy ul. Niecałej 20 w Lublinie na siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji UMWL / Lublin	Inwestycja zaniechana Nieruchomość została sprzedana w 2016 r. przez ZWL
202.	Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji UMWL / Lublin	Inwestycja zrealizowana
203.	Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie / Lublin	Inwestycja zrealizowana
204.	Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji UMWL / Lublin	Inwestycja zrealizowana
205.	Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji UMWL / Lublin	Inwestycja zrealizowana
206.	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	Departament Gospodarki i Innowacji / obszar województwa	Inwestycja zrealizowana Lublin, Zamość, Chełm
207.	Lubelskie Centrum Konferencyjne	Departament Mienia i Inwestycji UMWL / Lublin	Inwestycja zrealizowana

Tab. 29. Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
208.	Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie	Ministerstwo Zdrowia / Lublin	Inwestycja w realizacji
209.	Budowa SOR wraz z wyposażeniem i lądowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej)	Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim / Poniatowa	Inwestycja zaniechana
210.	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Lądowiskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Lublinie)	Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia / Lublin	Inwestycja zrealizowana
211.	SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie / Lubartów	Inwestycja zaniechana

Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego nieujęte w PZPW 2015:

- doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych – projekt w trakcie realizacji,
- budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, szpitalnym oddziałem ratowniczym, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców w Lublinie – realizacja zakończona.

2.8. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej

Tab. 30. Zadania inwestycyjne umieszczone w Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 2012-2016.

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
212.	Budowa placówki Straży Granicznej Ulhówek	Nadbużański Oddział Straży Granicznej / Ulhówek	Inwestycja odroczone

Nowe zadania inwestycyjne zgłoszone przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie:

- Budowę wieży obserwacyjnej w m. Kostomłoty - gm. Kodeń, działka nr 249/4;
- Budowę systemu ochrony granicy państwowej - w pasie granicznym o szerokości 15 m na całym odcinku granicy państwa znajdującym się na terenie województwa lubelskiego.

2.9. Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górnictwem

Tab. 31. Zadania inwestycyjne umieszczone w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły

Lp.	Nazwa inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania / lokalizacja inwestycji	Stopień realizacji zadania
213.	Wykonanie otworu badawczego Celejów GT-1 dla określenia możliwości występowania wód geotermalnych w miejscowości Celejów (lista 1, poz. 1134)	Termy Celejów / Wąwolnica	Inwestycja zrealizowana


3. PODSUMOWANIE

Ocena stopnia aktualności ustaleń PZPWL 2015 dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obejmuje:

- zrealizowany zakres zadań inwestycyjnych wskazanych w dokumencie planu;
- ilość niezrealizowanych zadań inwestycyjnych wskazanych w planie, które przewidziano do wykonania w aktualnych programach rozwojowych;
- skalę nowych przedsięwzięć inwestycyjnych;
- zgodność nowych zamierzeń inwestycyjnych z kierunkowymi ustaleniami planu dotyczącymi kształtowania systemów infrastrukturalnych, w tym w kontekście przewidzianych w prawie możliwości zastosowania specjalnych trybów realizacji inwestycji (na podstawie tzw. specustaw).

Drogi krajowe:

- inwestycje wskazane w PZPWL 2015 nadal pozostają w fazie realizacji;
- nowe, planowane zadania inwestycyjne obejmują przede wszystkim realizację układów obwodnicowych miast, w ciągach komunikacyjnych przewidzianych w planie jako elementy regionalnego i ponadregionalnego systemu komunikacyjnego;

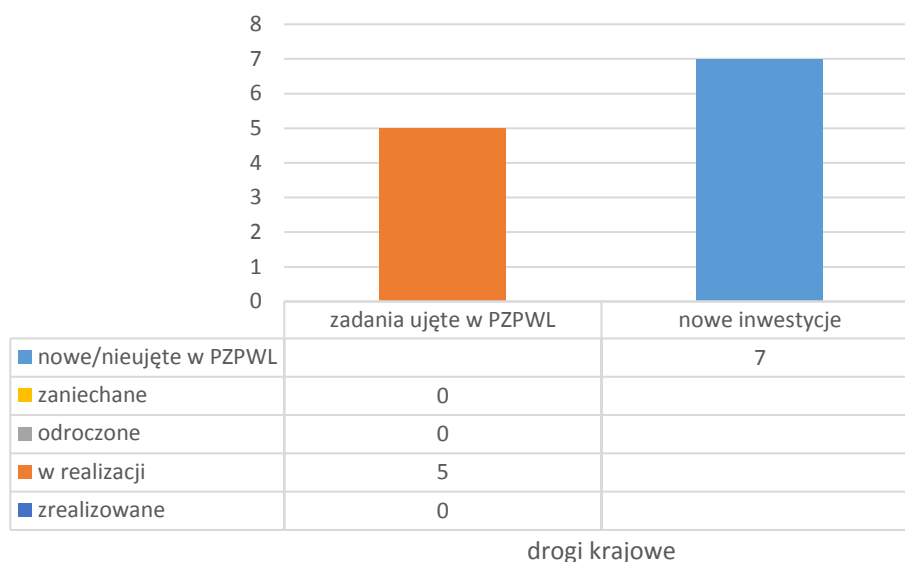


- inwestycje drogowe, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, mogą być realizowane na podstawie decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) – w ramach kompetencji, zarząd województwa opiniuje projekty ZRID w zakresie zgodności z regionalną polityką rozwoju przestrzennego.

Pomimo relatywnie dużej skali nowych inwestycji w zakresie dróg krajowych, samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego poprzez opiniowanie projektów ZRID na podstawie określonego w PZPWL 2015 docelowego układu funkcjonalnego podstawowych powiązań drogowych na obszarze województwa.

Drogi wojewódzkie:

- inwestycje wskazane w PZPWL 2015 w 90% zostały zrealizowane;
- nowe, planowane zadania inwestycyjne wpisują się określony w PZPWL 2015 docelowy układ funkcjonalnego podstawowych regionalnych powiązań drogowych na obszarze województwa;

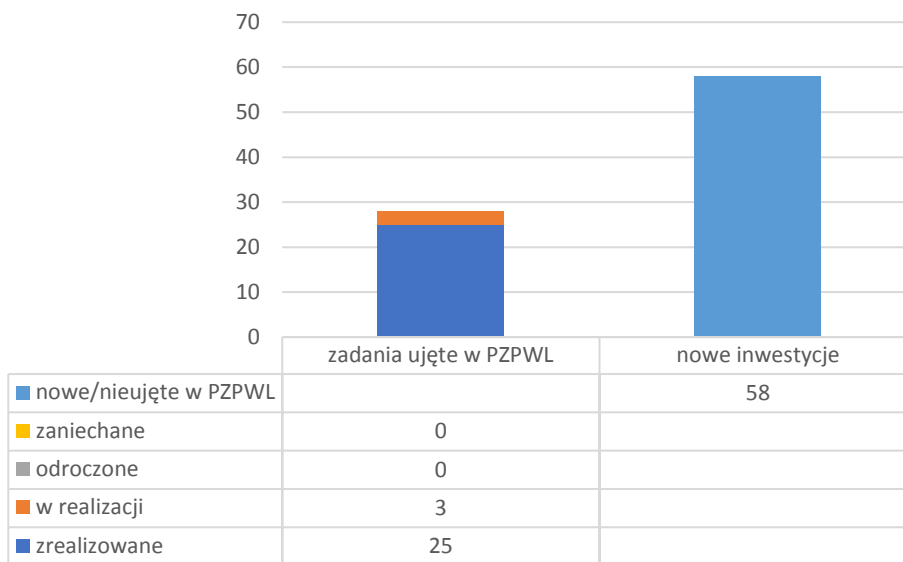

drogi wojewódzkie

- inwestycje drogowe, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, mogą być realizowane na podstawie decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) – w ramach kompetencji, zarząd województwa opiniuje projekty ZRID w zakresie zgodności z regionalną polityką rozwoju przestrzennego.


Pomimo relatywnie dużej skali nowych inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich, samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego poprzez opiniowanie projektów ZRID na podstawie określonego w PZPWL 2015 docelowego układu funkcjonalnego podstawowych regionalnych powiązań drogowych na obszarze województwa.

Trasy rowerowe:

- inwestycja wskazana w PZPWL 2015 została zrealizowana;
- dla wskazanych w SRWL 2030 przedsięwzięć obejmujących:
 - budowę infrastruktury Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR),
 - rozbudowę infrastruktury turystycznej: Centralnego Szlaku Rowerowego Rostocza, Green Velo,
 zastosowanie mają określone w PZPWL 2015 przestrzenne warunki realizacji regionalnej polityki rozwoju przestrzennego dotyczące zasad kierunkowego rozwoju infrastruktury transportu rowerowego.

Linie kolejowe:

- inwestycje wskazane w PZPWL 2015 zostały zrealizowane w 45%;
- niezrealizowane, wskazane w PZPWL 2015 inwestycje kolejowe pozostają aktualne i przewidziane zostały do realizacji w najbliższej perspektywie programowania;
- nowe, planowane zadania inwestycyjne w większości wpisują się w określony w PZPWL 2015 system powiązań kolejowych.

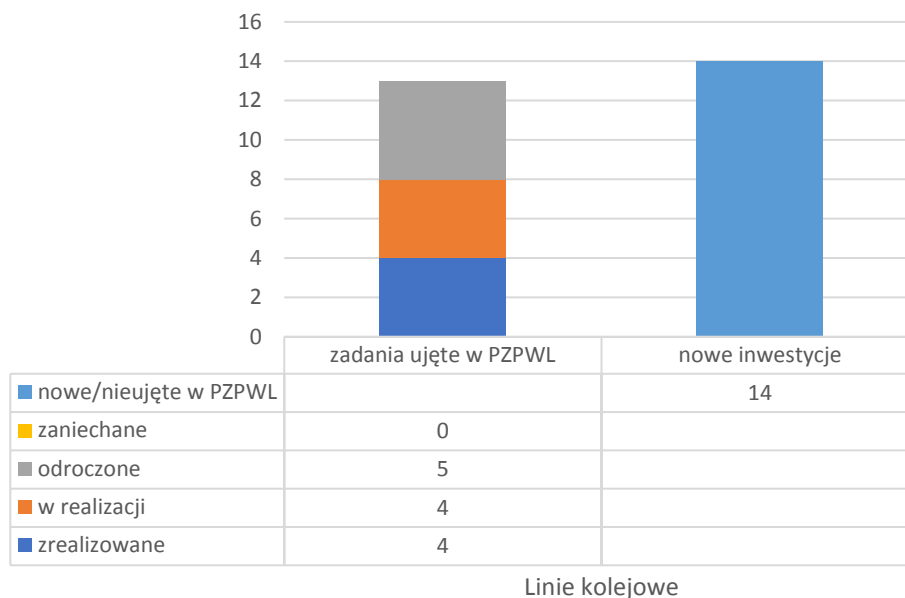

- inwestycje kolejowe, zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, na terenach nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego mogą być realizowane na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Samorząd województwa może w najbliższej perspektywie prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej poprzez opiniowanie wniosków do wojewody o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie określonego w PZPWL 2015 układu funkcjonalnego powiązań kolejowych na obszarze województwa.

W wymiarze szczegółowym celowa jest perspektywiczna aktualizacja ustaleń planu dotyczących elementów kształtujących powiązania regionalne i ponadregionalne oraz układ aglomeracyjny, tj. w zakresie ciągów kolejowych relacji:


- Lublin - Kraśnik - Ożarów – Opatów - Daleszyce - Sitkówka Nowiny - (Kielce),
- Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj,
- Lublin - Łęczna (Bogdanka).

Teleinformatyka:

- 1 inwestycja wskazana w PZPWL 2015 została zrealizowana;
- brak nowych, perspektywicznych przedsięwzięć z zakresu teleinformatyki, kwalifikujących się do katalogu zadań i inwestycji celu publicznego PZPWL 2015.

Elektroenergetyka:

- inwestycje wskazane w PZPWL 2015 zostały zrealizowane w 28%;
- wśród wskazanych w PZPWL 2015 inwestycji w sektorze elektroenergetyki dominujący udział mają zadania niezrealizowane, przewidziane do wykonania w obecnej lub przyszłej perspektywie programowania – stanowią one ponad 60% planowanych przedsięwzięć;
- nowe zadania inwestycyjne umieszczone w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 oraz w projekcie Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 obejmują w większości przebudowę lub rozbudowę istniejących elementów infrastruktury elektroenergetycznej.

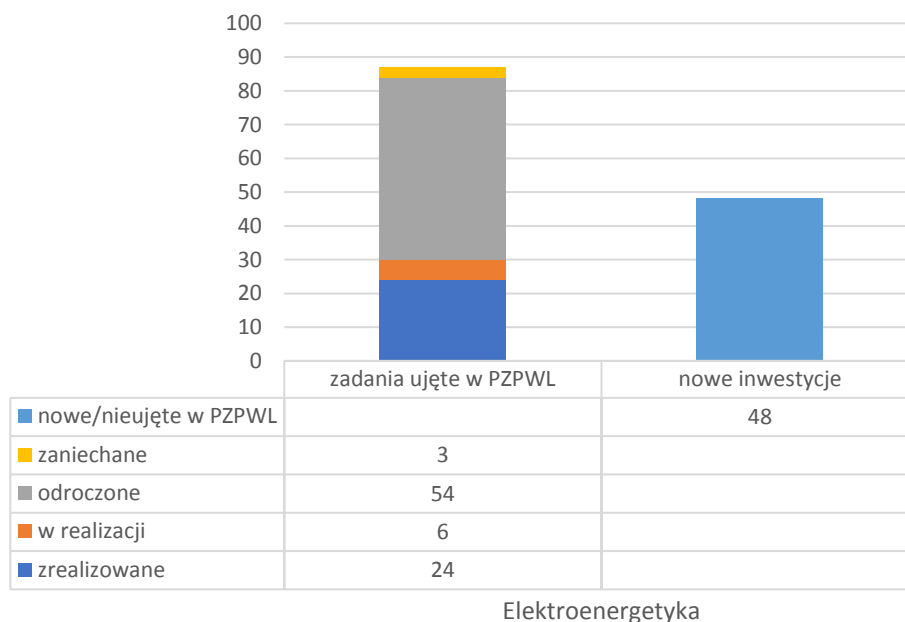


- Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, część inwestycji z zakresu elektroenergetyki może być realizowanych na podstawie decyzji administracyjnej – ramach kompetencji zarząd województwa wyraża opinię w zakresie zgodności przedsięwzięć z regionalną polityką rozwoju przestrzennego.

Pomimo relatywnie dużej skali nowych inwestycji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej, w najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego na podstawie określonych w PZPWL 2015 kierunków rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego.

Paliwa energetyczne:


- inwestycje wskazane w PZPWL 2015 zostały zrealizowane w 50%;
- wszystkie niezrealizowane, wskazane w PZPWL 2015 inwestycje w zakresie infrastruktury przesyłu paliw pozostają aktualne;
- dla realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu paliw energetycznych, zastosowanie mają kierunkowe ustalenia PZPWL 2015, dotyczące przestrzennych warunków rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej paliw energetycznych.

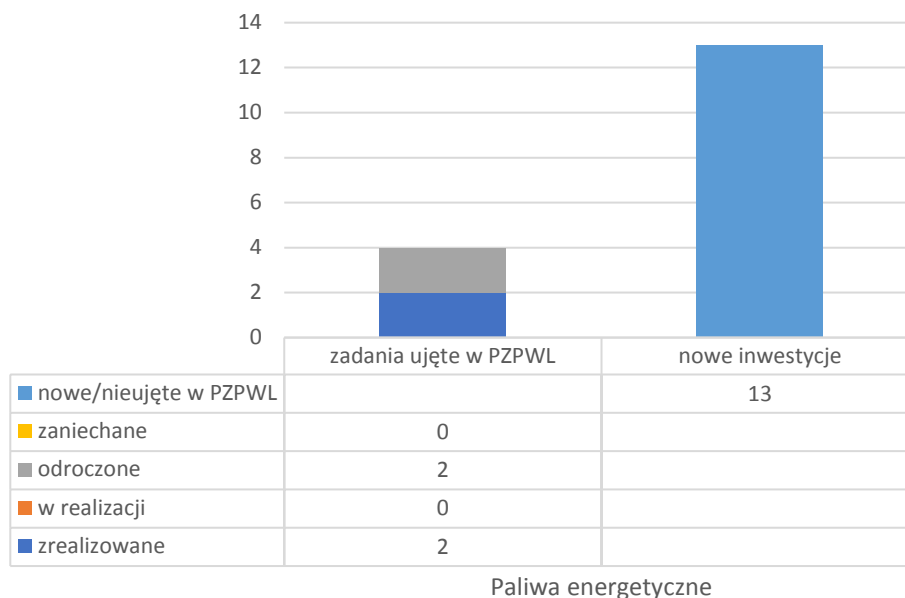

Pomimo relatywnie dużej skali nowych inwestycji w zakresie infrastruktury przesyłu i dystrybucji paliw energetycznych, w najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego na podstawie ustaleń ogólnych PZPWL 2015.

Infrastruktura oczyszczania i odprowadzania ścieków:


- inwestycje wskazane w PZPWL 2015 zostały zrealizowane w 89% – realizacja pozostałych inwestycji została w większości zaniechana;
- nowe zadania inwestycyjne, przewidziane w projekcie VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2021) obejmują przede wszystkim rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w określonych aglomeracjach;
- dla realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury oczyszczania i odprowadzania ścieków, zastosowanie mają określone w PZPWL 2015 zasady i kierunki porządkowania gospodarki ściekowej na terenie województwa lubelskiego.

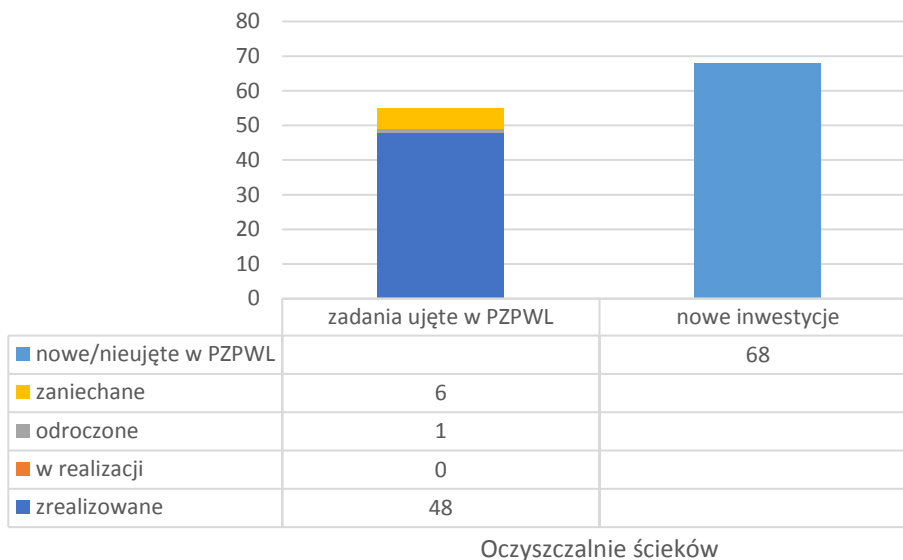

Pomimo relatywnie dużej skali nowych inwestycji w zakresie infrastruktury oczyszczania i odprowadzania ścieków, w najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego na podstawie określonych w PZPW 2015 zasad i kierunków porządkowania gospodarki ściekowej na terenie województwa lubelskiego.

Infrastruktura odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

- inwestycje wskazane w PZPW 2015 zostały zrealizowane w 95%;
- aktualnie trwają prace nad nowelizacją Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – po uchwaleniu, dokument wskaże nowe potrzeby inwestycyjne w zakresie niezbędnej infrastruktury do gospodarowania odpadami na terenie województwa lubelskiego z uwzględnieniem okresu ich realizacji w latach 2023-2028.

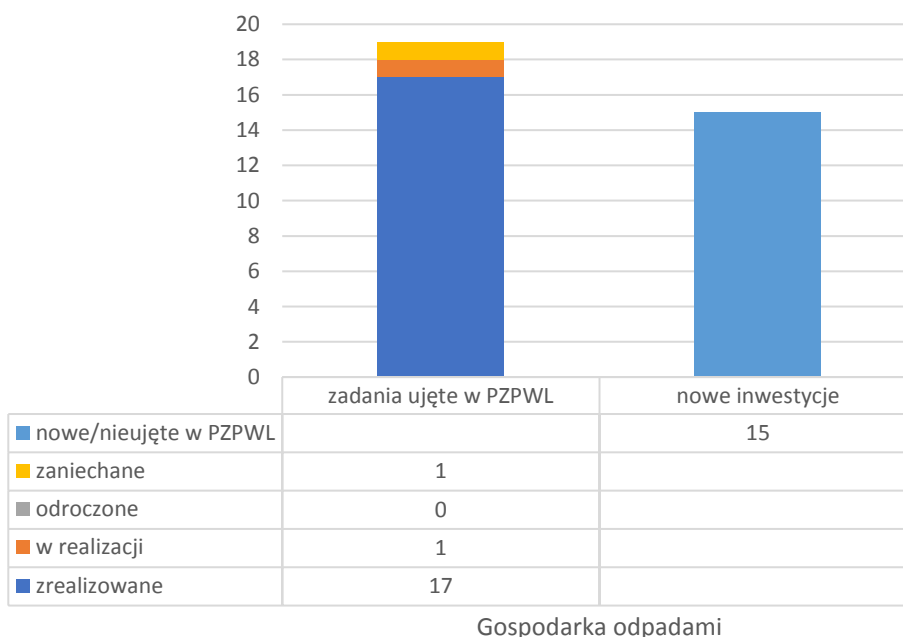


W perspektywicznej aktualizacji regionalnej polityki rozwoju przestrzennego celowa jest weryfikacja ustaleń PZPWL 2015 w zakresie:

- regionów funkcjonalnych gospodarowania odpadami komunalnymi,
- potencjalnych inwestycji wynikających z nowelizacji Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

W najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego na podstawie zasad ogólnych i szczegółowych wskazanych w PZPWL 2015 dla sektora gospodarki odpadami.

Gospodarka wodna:

- inwestycje wskazane w PZPWL 2015 zostały zrealizowane w 50%;
- 32 niezrealizowane, wskazane w PZPWL 2015 inwestycje z zakresu gospodarki wodnej pozostają aktualne i przewidziane zostały do realizacji w najbliższej perspektywie programowania;
- nowe zadania inwestycyjne umieszczone w Programie przeciwdziałania skutkom suszy oraz w projekcie aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły obejmują w większości inwestycje polegające na budowie nowych zbiorników retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych.

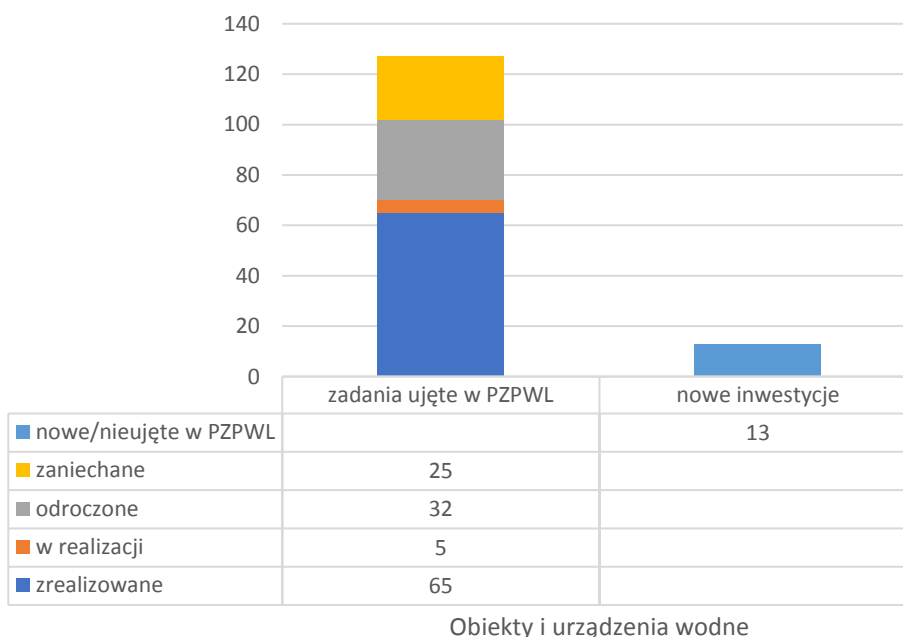

Tab. 32. Zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej

	Zbiorniki retencyjne	Systemy melioracyjne	Wały przeciwpowodziowe	Koryta i zabezpieczenia brzegów rzek
zrealizowane	9	1	31	23
w realizacji	0	0	5	0
odroczone	21	9	2	0

zaniechane	5	5	1	13
------------	---	---	---	----

W perspektywicznej aktualizacji regionalnej polityki rozwoju przestrzennego celowa jest weryfikacja ustaleń PZPWL 2015 w zakresie:

- nowych inwestycji umieszczonych w Programie przeciwdziałania skutkom suszy oraz w projekcie aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły.

W najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego na podstawie wskazanych w PZPWL 2015 kierunków gospodarowania zasobami wód śródlądowych.


Ochrona Pomników Zagłady:

- inwestycja wskazana w PZPWL 2015 w trakcie realizacji;
- brak nowych, perspektywicznych przedsięwzięć z zakresu ochrony pomników zagłady, kwalifikujących się do katalogu zadań i inwestycji celu publicznego PZPWL 2015.

W najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego w zakresie inwestycji celu publicznego służących ochronie Pomników Zagłady na podstawie dotychczasowych ustaleń PZPWL 2015.

Obiekty administracji publicznej i ochrony zdrowia:

- inwestycje wskazane w PZPWL 2015 zostały zrealizowane w 70%;
- zaniechane, wskazane w PZPWL 2015 inwestycje z zakresu ochrony zdrowia pozostają aktualne i przewidziane zostały do realizacji w najbliższej perspektywie programowania

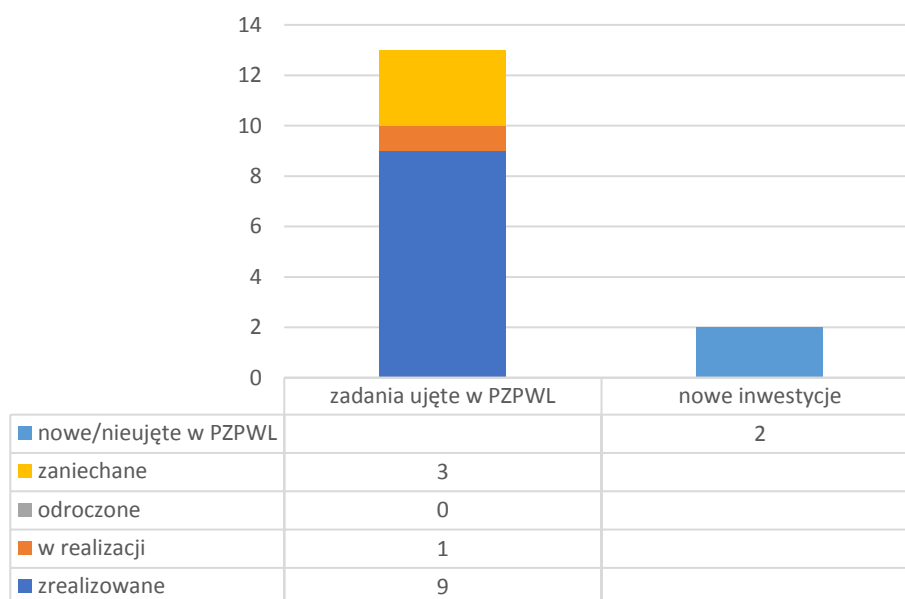

Obiekty administracji publicznej i ochrony zdrowia

W perspektywicznej aktualizacji regionalnej polityki rozwoju przestrzennego celowa jest weryfikacja ustaleń PZPWL 2015 w zakresie inwestycji obejmujących budowę i rozbudowę obiektów administracji publicznej i ochrony zdrowia.

W najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego w przedmiotowym zakresie na podstawie ustaleń ogólnych PZPWL 2015.

Obronność państwa i ochrona granicy państwowej:

- 1 inwestycja wskazana w PZPWL 2015 została odroczone;
- wskazano 2 nowe zadania inwestycyjne polegające na budowie systemu ochrony granicy państwowej na całym odcinku granicy państwa znajdującym się na terenie województwa lubelskiego.

W perspektywicznej aktualizacji regionalnej polityki rozwoju przestrzennego celowa jest weryfikacja ustaleń PZPWL 2015 w zakresie inwestycji obejmujących budowę wieży obserwacyjnej w gminie Kodeń oraz budowę systemu ochrony granicy państwowej.

W najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego w przedmiotowym zakresie na podstawie ustaleń ogólnych PZPWL 2015.

Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin:

- 1 inwestycja wskazana w PZPWL 2015 została zrealizowana;
- brak nowych, perspektywicznych przedsięwzięć z zakresu rozpoznania geologicznego (surowcowego) województwa lubelskiego, kwalifikujących się do katalogu zadań i inwestycji celu publicznego PZPWL 2015.

W najbliższej perspektywie samorząd województwa może prowadzić regionalną politykę rozwoju przestrzennego w zakresie inwestycji celu publicznego służących poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu złóż kopalin na podstawie dotychczasowych ustaleń PZPWL 2015.

4. SPIS TABEL

Tab. 1. Dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów	6
Tab. 2. Dokumenty przyjęte przez właściwego ministra	8
Tab. 3. Dokumenty przyjęte przez Sejmik Województwa Lubelskiego/Zarząd Województwa Lubelskiego	8
Tab. 4. Budowa autostrady i dróg ekspresowych (z uwzględnieniem odcinków dróg stanowiących obwodnice miejscowości).....	10
Tab. 5. Budowa obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych	12
Tab. 6. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wojewódzkich	12
Tab. 7. Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich	15
Tab. 8. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wojewódzkich	20
Tab. 9. Trasy rowerowe.....	20
Tab. 10. Teleinformatyka.....	21
Tab. 11. Modernizacja linii kolejowych.....	21
Tab. 12. Modernizacja mostów.....	23
Tab. 13. Modernizacja linii kolejowych.....	24
Tab. 14. Elektroenergetyka	26
Tab. 15. Gospodarka paliwowa	35
Tab. 16. Budowa oczyszczalni ścieków (wg gmin wiodących w aglomeracjach)	37
Tab. 17. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	38
Tab. 18. Gospodarka odpadami	43
Tab. 19. Budowa zbiorników retencyjnych.....	46
Tab. 20. Rozbudowa / modernizacja zbiorników retencyjnych	50
Tab. 21. Odbudowa i modernizacja systemów melioracyjnych	55
Tab. 22. Budowa / rozbudowa wałów przeciwpowodziowych	58
Tab. 23. Odbudowa koryt i zabezpieczenie brzegów rzek	67
Tab. 24. Zadania inwestycyjne umieszczone w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły	73
Tab. 25. Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego	75
Tab. 26. Zadania inwestycyjne umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029.....	75
Tab. 27. Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego.....	78
Tab. 28. Zadania inwestycyjne umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029.....	78

Tab. 29. Zadania inwestycyjne umieszczone w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego	80
Tab. 30. Zadania inwestycyjne umieszczone w Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 2012-2016.	81
Tab. 31. Zadania inwestycyjne umieszczone w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły...	81
Tab. 32. Zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej	88

5. SŁOWNIK SKRÓTÓW

AKPOŚK - Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

aPZPR - aktualizacja Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

B+R - działalność badawczo-rozwojowa

BDL - Bank Danych Lokalnych

BDOT - Baza Danych Obiektów Topograficznych

BPP - Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

CNBiSW - Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim

CPK - Centralny Port Komunikacyjny

DSiR - Departament Strategii i Rozwoju

DSP - Dowództwo Sił Powietrznych

DWL - Dowództwo Wojsk Lądowych

DWSPEC - Dowództwo Wojsk Specjalnych

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GUGiK - Główny Urząd Geodezji i Kartografii

GUS - Główny Urząd Statystyczny

jcwp - jednolite części wód powierzchniowych

JST - Jednostka Samorządu terytorialnego

KPZK - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

KSRR - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

LHS - Linia Hutnicza Szerokotorowa

LOM - Lubelski Obszar Metropolitalny

LZW - Lubelskie Zagłębie Węglowe

MOF - Miejski Obszar Funkcjonalny

mpzp - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

NOSG – Nadbużański Oddział Straży Granicznej

OF - obszar funkcjonalny

OSI - obszar strategicznej interwencji

OZE - Odnawialne Źródła Energii

PGE - Polska Grupa Energetyczna

PGW WP - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

PKB - Produkt krajowy brutto

PKP PLK - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PPI - Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW WP

PPSS - Plan przeciwdziałania skutkom suszy

PSE - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

PSG - Polska Sieć Gazownictwa sp. z o.o.

PZPWL - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

pzpzw - plan zagospodarowania przestrzennego województwa

RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SOR - Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

SRWL - Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego

SSE - Specjalna Strefa Ekonomiczna

suikzp - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

TEN-T - Transeuropejskie Sieci Transportowe

UMWL - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

WDB - Wartość Dodana Brutto

WL - Województwo Lubelskie

WTR - Wiślana Trasa Rowerowa

WZMiUW - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

ZSRW - zintegrowana strategia rozwoju województwa

ZWL - Zarząd Województwa Lubelskiego
